

[illegible]

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実 施 数 量	設 計 数 量	摘 要
	排水構造物工							
		作業土工	床掘	標準（砂質土）	m3	23.2	20	排水構造物工集計表
		〃	埋戻（砂質土）	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	埋戻（砂質土）	最大埋戻幅1m未満	m3	15.8	20	排水構造物工集計表
		〃	基面整正	（砂質土）	m2	30.4	30	排水構造物工集計表
		側溝工	ﾌﾞﾚｯｷｽﾄL型側溝	1号L型側溝	m	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	36.1	36	排水構造物工集計表
		〃	〃	PU3-B300-H400	m	10.1	10	排水構造物工集計表
		〃	側溝蓋	PC4-B300	枚	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝	角ﾌﾘｰﾑ	m	0.0	0	排水構造物工集計表
		場所打水路工	現場打水路	1号U型側溝	m	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	2号U型側溝	m	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	3号U型側溝	m	9.2	9	排水構造物工集計表
		〃	〃	4号U型側溝	m	2.4	2	排水構造物工集計表
		管渠工	管渠	PVC-150	m	13.9	14	排水構造物工集計表
		〃	〃	PVC-250	m	6.3	6	排水構造物工集計表
		〃	〃	PVC-600	m	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	塩ビ管(VUφ150)	m	5.3	5	排水構造物工集計表
		集水樹工	集水樹	取水工	箇所	1.0	1	排水構造物工集計表
		〃	〃	落水工	箇所	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	呑口工	箇所	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	吐口工	箇所	1.0	1	排水構造物工集計表
		〃	〃	1号集水樹	箇所	3.0	3	排水構造物工集計表
		〃	〃	2号集水樹	箇所	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	3号集水樹	箇所	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	4号集水樹	箇所	0.0	0	排水構造物工集計表
		〃	〃	5号集水樹	箇所	0.0	0	排水構造物工集計表
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	5.9	6	構造物撤去工集計表
		〃	舗装版取壊し	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(t=5cm)	m2	193.4	190	構造物撤去工集計表
		〃	〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(t=3cm)	m2	65.9	70	構造物撤去工集計表
		〃	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(t=3cm)	m	7.8	8	構造物撤去工集計表
		〃	〃	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(t=5cm)	m	27.9	28	構造物撤去工集計表
	舗装工							
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装					
		〃	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(t=5cm)	m2	374.2	370	舗装工集計表
		〃	上層路盤	M-30(t=10cm)	m2	377.3	380	舗装工集計表
		〃	下層路盤	RC-40(t=15cm)	m2	380.4	380	舗装工集計表
		〃	路肩舗装					
		〃	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(t=5cm)	m2	28.0	28	舗装工集計表
		〃	上層路盤	M-30(t=10cm)	m2	28.0	28	舗装工集計表
		〃	下層路盤	RC-40(t=15cm)	m2	28.0	28	舗装工集計表
		〃	歩道舗装					
		〃	表層	再生細粒度ｱｽｺﾝ(t=3cm)	m2	54.9	55	舗装工集計表
		〃	路盤	RC-40(t=10cm)	m2	54.9	55	舗装工集計表
		〃	坂路舗装					
		〃	表層	σck=18N/mm2(t=7cm)	m2	42.3	42	舗装工集計表
		〃	路盤	RC-40(t=10cm)	m2	42.3	42	舗装工集計表

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実 施 数 量	設 計 数 量	摘 要
	縁石工							
		作業土工	床掘	標準（砂質土）	m3	0.0	0	縁石工集計表
		〃	埋戻（砂質土）	最大埋戻幅1m未満	m3	4.8	5	縁石工集計表
		〃	基面整正	（砂質土）	m2	12.7	13	縁石工集計表
		縁石工	歩車道境界ブロック	BB-M150	m	7.5	8	縁石工集計表
		〃	〃	BB-E20	m	31.3	31	縁石工集計表
	区画線工							
		区画線工	溶融式区画線	15cm・白色・実線	m	138.9	139	区画線工集計表
				15cm・白色・破線	m	11.0	11	区画線工集計表
				45cm・白色	m	41.2	41	区画線工集計表
				15cm換算・白色	m	76.0	76	区画線工集計表
			区画線消去		m	177.4	177	区画線工集計表
	道路付属物撤去工							
		作業土工	床掘	標準（砂質土）	m3	56.2	56	道路付属物撤去工集計表
			埋戻	標準（砂質土）	m3	52.4	52	道路付属物撤去工集計表
		舗装版破砕工	舗装切断	As舗装（t=3cm）	m	46.8	47	道路付属物撤去工集計表
			舗装版破砕	As舗装（t=3cm）	m2	45.9	46	道路付属物撤去工集計表
		舗装工	上層路盤	RC-40（t=10cm）	m2	45.9	46	道路付属物撤去工集計表
			表層	再生細粒度アスコン（t=3cm）	m2	45.9	46	道路付属物撤去工集計表
		道路標識撤去工	標識柱撤去		基	2.0	2	道路付属物撤去工集計表
		道路照明撤去工	道路照明灯撤去		基	1.0	1	道路付属物撤去工集計表
	道路付属物設置工							
		作業土工	床掘	標準（砂質土）	m3	56.2	56	道路付属物設置工集計表
			埋戻	標準（砂質土）	m3	52.4	52	道路付属物設置工集計表
		舗装版破砕工	舗装切断	As舗装（t=3cm）	m	46.8	47	道路付属物設置工集計表
			舗装版破砕	As舗装（t=3cm）	m2	45.9	46	道路付属物設置工集計表
		舗装工	上層路盤	RC-40（t=10cm）	m2	45.9	46	道路付属物設置工集計表
			表層	再生細粒度アスコン（t=3cm）	m2	45.9	46	道路付属物設置工集計表
		道路標識設置工	標識柱設置		基	2.0	2	道路付属物設置工集計表
			基礎碎石		m2	0.4	0.4	道路付属物設置工集計表
		道路照明設置工	道路照明灯設置		基	1.0	1	道路付属物設置工集計表
			基礎碎石		m2	0.2	0.2	道路付属物設置工集計表
	運搬処理工							
		残土処理工	残土運搬		m3	71.4	70	38+33.4
			残土処理		m3	71.4	70	
		As殻処理工	殻運搬		m3	14.4	14	11.6+1.4+1.4
			殻処理		t	33.8	34	
		Co殻処理工	殻運搬		m3	5.9	6	5.9
			殻処理		t	13.9	14	

土量配分表

◆道路土工

掘削工			
掘削(土砂)	砂質土	129.6	m3
	耕土	36.5	m3
掘削(軟岩)	軟岩Ⅰ		m3
	軟岩Ⅱ		m3
掘削(硬岩)	中硬岩		m3
	硬岩		m3
土砂合計		166.1	m3
軟岩合計		0.0	m3
硬岩合計		0.0	m3

◆作業土工

機械床堀			
	砂質土	190.5	m3
	レキ質土		m3
	軟岩Ⅰ		m3
	軟岩Ⅱ		m3
人力床堀			
	砂質土		m3
	レキ質土		m3
	軟岩Ⅰ		m3
	軟岩Ⅱ		m3
土砂合計		190.5	m3
軟岩合計		0.0	m3

◆不足土

購入土		0.0	m3
-----	--	-----	----

◆道路土工

盛土工			
路床盛土	2.5m未満	50.9	m3
	2.5m以上4.0m未満		m3
	4.0m以上		m3
路体盛土	2.5m未満	8.3	m3
	2.5m以上4.0m未満		m3
	4.0m以上		m3
路肩盛土		42.0	m3
畦畔盛土		0.0	m3
坂路盛土		4.5	m3
盛土合計		105.7	m3

◆作業土工

埋戻種別C	砂質土	0.0	m3
埋戻種別D	砂質土	148.2	m3
埋戻種別D	耕土	2.8	m3
埋戻合計	砂質土	148.2	m3
埋戻合計	耕土	2.8	m3

◆残土処理工

残土	砂質土	38.0	m3
残土	耕土	33.4	m3
残土	軟岩Ⅰ		m3
残土	軟岩Ⅱ		m3
コンクリート殻	無筋構造物		m3
コンクリート殻	鉄筋構造物		m3
アスファルト殻			m3

$$105.7/0.9=117.4$$

$$148.2/0.9=164.7$$

$$2.8/0.9=3.1$$

$$129.6+190.5-117.4-164.7=38.0$$

$$36.5-3.1=33.4$$

残土(砂質土)

残土(耕土)

作業土工

集 計 表

種 別	床掘	埋戻			基面整正				
	E (S)	FuC	FuD	FuD (C)	K (S)				
擁壁工	11.7		5.9	2.8	11.7				
ブロック積工	43.2		16.9		19.8				
排水構造物工	23.2	0.0	15.8		30.4				
縁石工	0.0		4.8		12.7				
道路付属物撤去工	56.2		52.4						
道路付属物設置工	56.2		52.4						
合 計	m3	m3	m3	m3	m2				
	190.5	0.0	148.2	2.8	74.6				

計第 1 表										
掘削工					数 量 計 算 書					
測 点	距 離 (m)	C(S) : 土砂掘削 (砂質土)			C(G) : 土砂掘削 (耕土)					
		断面	平 均	立積 (m3)	断面	平 均	立積 (m3)			
NO. 0	-	1.8			0.0					
NO. 0+6.82	6.8	0.9	1.35	9.2	0.0	0.00	0.0			
NO. 1	13.2	1.1	1.00	13.2	1.4	0.70	9.2			
NO. 1+5.0	5.0	1.3	1.20	6.0	1.3	1.35	6.8			
NO. 1+15.0	10.0	1.9	1.60	16.0	0.6	0.95	9.5			
NO. 2	5.0	2.0	1.95	9.8	0.7	0.65	3.3			
BC. 1	3.5	2.1	2.05	7.2	0.7	0.70	2.5			
SP. 1	14.8	4.5	3.30	48.8	0.0	0.35	5.2			
EC. 1	14.8	4.2	4.35	64.4	0.6	0.30	4.4			
BC. 2	6.4	3.2	3.70	23.7	0.5	0.55	3.5			
SP. 2	11.7	6.7	4.95	57.9	0.0	0.25	2.9			
NO. 5	8.9	4.4	5.55	49.4	0.0	0.00	0.0			
EC. 2	2.8	3.8	4.10	11.5	0.6	0.30	0.8			
NO. 6	17.2	2.8	3.30	56.8	0.6	0.60	10.3			
BC. 3	3.0	1.1	1.95	5.9	0.7	0.65	2.0			
SP. 3	12.3	1.8	1.45	17.8	0.6	0.65	8.0			
NO. 7	4.7	2.4	2.10	9.9	0.6	0.60	2.8			
EC. 3	7.6	3.0	2.70	20.5	0.8	0.70	5.3			
BC. 4	14.0	3.1	3.05	42.7	0.6	0.70	9.8			
SP. 4	14.6	1.7	2.40	35.0	0.1	0.35	5.1			
NO. 9	3.8	1.1	1.40	5.3	0.7	0.40	1.5			
EC. 4	10.8	0.7	0.90	9.7	1.1	0.90	9.7			
NO. 10	9.2	0.8	0.75	6.9	1.1	1.10	10.1			
IP. 5	11.0	1.2	1.00	11.0	0.0	0.55	6.1			
NO. 11	9.0	0.9	1.05	9.5	0.0	0.00	0.0			
BC. 6	15.6	1.6	1.25	19.5	0.0	0.00	0.0			
NO. 12	4.4	1.8	1.70	7.5	0.0	0.00	0.0			
SP. 6	4.1	1.1	1.45	5.9	0.0	0.00	0.0			
EC. 6	8.6	1.4	1.25	10.8	0.0	0.00	0.0			
	1.2	1.4	1.40	1.7	0.0	0.00	0.0			
	2.3	0.0	0.70	1.6	0.0	0.00	0.0			
H-1	-	0.5								
	2.5	0.5	0.50	1.3						
	13.1	0.5	0.50	6.6						
	-	0.7								
H-3	9.8	0.7	0.70	6.9						
	4.0	0.7	0.70	2.8						
	2.5	0.7	0.70	1.8						
合 計	90.2			129.6			36.5			

計第 2 表

路床盛土・路体盛土

数量計算書

測点	距離 (m)	B1 : 路床盛土			B2 : 路体盛土					
		断面	平均	立積(m ³)	断面	平均	立積(m ³)			
NO.0	-	0.0			0.0					
NO.0+6.82	6.8	1.8	0.90	6.1	0.0	0.00	0.0			
NO.1	13.2	1.9	1.85	24.4	0.5	0.25	3.3			
NO.1+5.0	5.0	1.8	1.85	9.3	0.5	0.50	2.5			
NO.1+15.0	10.0	0.1	0.95	9.5	0.0	0.25	2.5			
NO.2	5.0	0.1	0.10	0.5	0.0	0.00	0.0			
BC.1	3.5	0.1	0.10	0.4	0.0	0.00	0.0			
SP.1	14.8	0.0	0.05	0.7	0.0	0.00	0.0			
EC.1	14.8	0.1	0.05	0.7	0.0	0.00	0.0			
BC.2	6.4	0.0	0.05	0.3	0.0	0.00	0.0			
SP.2	11.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
NO.5	8.9	0.1	0.05	0.4	0.0	0.00	0.0			
EC.2	2.8	0.1	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0			
NO.6	17.2	0.1	0.10	1.7	0.0	0.00	0.0			
BC.3	3.0	0.5	0.30	0.9	0.0	0.00	0.0			
SP.3	12.3	0.1	0.30	3.7	0.0	0.00	0.0			
NO.7	4.7	0.1	0.10	0.5	0.0	0.00	0.0			
EC.3	7.6	0.1	0.10	0.8	0.0	0.00	0.0			
BC.4	14.0	0.1	0.10	1.4	0.0	0.00	0.0			
SP.4	14.6	0.8	0.45	6.6	0.9	0.45	6.6			
NO.9	3.8	2.3	1.55	5.9	3.2	2.05	7.8			
EC.4	10.8	3.3	2.80	30.2	3.1	3.15	34.0			
NO.10	9.2	3.5	3.40	31.3	2.0	2.55	23.5			
IP.5	11.0	1.5	2.50	27.5	1.1	1.55	17.1			
NO.11	9.0	0.1	0.80	7.2	0.0	0.55	5.0			
BC.6	15.6	0.1	0.10	1.6	0.0	0.00	0.0			
NO.12	4.4	0.1	0.10	0.4	0.0	0.00	0.0			
SP.6	4.1	0.1	0.10	0.4	0.0	0.00	0.0			
EC.6	8.6	0.1	0.10	0.9	0.0	0.00	0.0			
	1.2	0.1	0.10	0.1	0.0	0.00	0.0			
	2.3	0.0	0.05	0.1	0.0	0.00	0.0			
合 計	58.3			50.9			8.3			

計第 3 表

路肩盛土・畦畔盛土

数量計算書

測点	距離 (m)	B3 : 路肩盛土			B4 : 畦畔盛土		
		断面	平均	立積(m³)	断面	平均	立積(m³)
NO.0	-	0.0			0.0		
NO.0+6.82	6.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.1	13.2	1.1	0.55	7.3	0.0	0.00	0.0
NO.1+5.0	5.0	1.0	1.05	5.3	0.0	0.00	0.0
NO.1+15.0	10.0	1.2	1.10	11.0	0.0	0.00	0.0
NO.2	5.0	1.1	1.15	5.8	0.0	0.00	0.0
BC.1	3.5	1.0	1.05	3.7	0.0	0.00	0.0
SP.1	14.8	0.2	0.60	8.9	0.0	0.00	0.0
EC.1	14.8	0.8	0.50	7.4	0.0	0.00	0.0
BC.2	6.4	0.0	0.40	2.6	0.0	0.00	0.0
SP.2	11.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.5	8.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
EC.2	2.8	0.0	0.00	0.0	0.9	0.45	1.3
NO.6	17.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.45	7.7
BC.3	3.0	0.9	0.45	1.4	0.0	0.00	0.0
SP.3	12.3	0.0	0.45	5.5	0.7	0.35	4.3
NO.7	4.7	0.0	0.00	0.0	0.6	0.65	3.1
EC.3	7.6	0.2	0.10	0.8	0.0	0.30	2.3
BC.4	14.0	0.0	0.10	1.4	0.6	0.30	4.2
SP.4	14.6	0.7	0.35	5.1	0.2	0.40	5.8
NO.9	3.8	0.7	0.70	2.7	1.1	0.65	2.5
EC.4	10.8	0.7	0.70	7.6	0.7	0.90	9.7
NO.10	9.2	0.7	0.70	6.4	0.4	0.55	5.1
IP.5	11.0	0.8	0.75	8.3	0.0	0.20	2.2
NO.11	9.0	0.2	0.50	4.5	0.0	0.00	0.0
BC.6	15.6	0.0	0.10	1.6	0.0	0.00	0.0
NO.12	4.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
SP.6	4.1	0.1	0.05	0.2	0.0	0.00	0.0
EC.6	8.6	0.0	0.05	0.4	0.0	0.00	0.0
	1.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	2.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	58.3			42.0			0.0

計第 5 表

法面整形工

数 量 計 算 書

測 点	距 離 (m)	L1' : 法面整形 (切土部)			L2' : 法面整形 (盛土部)					
		法長	平 均	平積 (m2)	法長	平 均	平積 (m2)			
左側										
	—				0.0					
	2.8				1.1	0.55	1.5			
NO. 1	10.0				1.0	1.05	10.5			
NO. 1+5.0	5.0				0.9	0.95	4.8			
NO. 1+15.0	10.0				0.8	0.85	8.5			
NO. 2	5.0				0.7	0.75	3.8			
BC. 1	3.5				0.7	0.70	2.5			
	10.9				0.6	0.65	7.1			
	—				1.4					
SP. 1	4.8				1.3	1.35	6.5			
EC. 1	13.3				0.8	1.05	14.0			
BC. 2	6.4				0.6	0.70	4.5			
	11.6				0.3	0.45	5.2			
NO. 4+8.6	—				0.0					
	0.4				0.2	0.10	0.0			
	1.1				0.0	0.10	0.1			
H-1	—				0.0					
	0.9				0.7	0.35	0.3			
	0.5				0.7	0.70	0.4			
	0.7				0.0	0.35	0.2			
H-1	—				1.0					
	4.8				0.8	0.90	4.3			
H-1	—				0.0					
	0.7				0.5	0.25	0.2			
	1.6				0.0	0.25	0.4			
左側合計	61.2			0.0			51.0			

計第 5 表		法面整形工			数 量 計 算 書					
測 点	距 離 (m)	L1' : 法面整形 (切土部)			L2' : 法面整形 (盛土部)					
		法長	平 均	平積(m2)	法長	平 均	平積(m2)			
右側					0.0					
NO. 1	2.0				2.5	1.25	2.5			
NO. 1+5.0	3.0				2.5	2.50	7.5			
	8.3				2.4	2.45	20.3			
	0.9				0.3	1.35	1.2			
NO. 1+15.0	0.8				0.3	0.30	0.2			
	0.4				0.3	0.30	0.1			
	-				0.5					
NO. 2	4.6				0.4	0.45	2.1			
BC. 1	3.5				0.5	0.45	1.6			
	8.0				0.4	0.45	3.6			
	1.8				0.0	0.20	0.4			
	-				0.0					
SP. 1	0.5				0.1	0.05	0.0			
	1.5				0.0	0.05	0.1			
	-	0.0								
EC. 1	13.5	0.7	0.35	4.7						
	4.1	0.9	0.80	3.3						
	0.9	0.1	0.50	0.5						
BC. 2	1.7	0.1	0.10	0.2						
	5.6	0.2	0.15	0.8						
	0.6	0.0	0.10	0.1						
	-	0.0								
	0.9	0.3	0.15	0.1						
NO. 5	3.2	0.2	0.25	0.8						
	1.2	0.1	0.15	0.2						
NO. 5+0.8	-				0.0					
	0.6				0.4	0.20	0.1			
	0.8				0.4	0.40	0.3			
	0.8				0.0	0.20	0.2			
	-	0.8								
EC. 2	1.1	0.8	0.80	0.9						
	14.5	1.0	0.90	13.1						
	1.0	0.0	0.50	0.5						
小計	35.3			0.0			39.6			

計第 5 表		法面整形工			数 量 計 算 書					
測 点	距 離 (m)	L1' : 法面整形 (切土部)			L2' : 法面整形 (盛土部)					
		法長	平 均	平積 (m2)	法長	平 均	平積 (m2)			
右側										
	-	0.0								
BC. 6	3.6	0.1	0.05	0.2						
NO. 12	5.0	0.3	0.20	1.0						
	2.8	0.4	0.35	1.0						
	0.7	0.0	0.20	0.1						
	-				0.0					
	0.3				0.2	0.10	0.0			
SP. 6	0.8				0.2	0.20	0.2			
	4.9				0.0	0.10	0.5			
	-	0.0								
EC. 6	4.7	0.2	0.10	0.5						
	2.6	0.2	0.20	0.5						
	0.7	0.0	0.10	0.1						
ﾌﾞﾛｯｸ積										
NO. 0+2. 3	-	0.7								
NO. 0+6. 82	4. 5	0.7	0.70	3. 2						
NO. 0+15. 2	8. 4	0.0	0.35	2. 9						
ﾌﾞﾛｯｸ積										
NO. 0+6. 82	-	0.0								
N. 0+15. 2	8. 4	1. 4	0.70	5. 9						
NO. 1	4. 8	1. 3	1.35	6. 5						
小計	26. 1			18. 5			0. 0			
右側合計	61. 4			18. 5			39. 6			
合計	122. 6			18. 5			90. 6			

表 計 集 工 面 法

[illegible]

計第 6 表										
法面工					数 量 計 算 書					
測 点	距 離 (m)	L1 : 切土法面			L2 : 盛土法面					
		法長	平 均	平積 (m2)	法長	平 均	平積 (m2)			
左側										
	—				0.0					
	2.8				1.1	0.55	1.5			
NO. 1	10.0				1.0	1.05	10.5			
NO. 1+5.0	5.0				0.9	0.95	4.8			
NO. 1+15.0	10.0				0.8	0.85	8.5			
NO. 2	5.0				0.7	0.75	3.8			
BC. 1	3.5				0.7	0.70	2.5			
	10.9				0.6	0.65	7.1			
	—				1.4					
SP. 1	4.8				1.3	1.35	6.5			
EC. 1	13.3				0.8	1.05	14.0			
BC. 2	6.4				0.6	0.70	4.5			
	11.6				0.3	0.45	5.2			
NO. 4+8.6	—				0.0					
	0.4				0.2	0.10	0.0			
	1.1				0.0	0.10	0.1			
H-1	—				0.0					
	0.9				0.7	0.35	0.3			
	0.5				0.7	0.70	0.4			
	0.7				0.0	0.35	0.2			
H-1	—				1.0					
	4.8				0.8	0.90	4.3			
H-1	—				0.0					
	0.7				0.5	0.25	0.2			
	1.6				0.0	0.25	0.4			
左側合計	61.2			0.0			51.0			

計第 6 表		法面工			数 量 計 算 書					
測 点	距 離 (m)	L1 : 切土法面			L2 : 盛土法面					
		法長	平 均	平積(m2)	法長	平 均	平積(m2)			
右側					0.0					
	2.0				2.5	1.25	2.5			
NO. 1+5.0	3.0				2.5	2.50	7.5			
	8.3				2.4	2.45	20.3			
	0.9				0.3	1.35	1.2			
NO. 1+15.0	0.8				0.3	0.30	0.2			
	0.4				0.3	0.30	0.1			
	-				0.5					
NO. 2	4.6				0.4	0.45	2.1			
BC. 1	3.5				0.5	0.45	1.6			
	8.0				0.4	0.45	3.6			
	1.8				0.0	0.20	0.4			
	-				0.0					
SP. 1	0.5				0.1	0.05	0.0			
	1.5				0.0	0.05	0.1			
	-	0.0								
EC. 1	13.5	0.7	0.35	4.7						
	4.1	0.9	0.80	3.3						
	0.9	0.1	0.50	0.5						
BC. 2	1.7	0.1	0.10	0.2						
	5.6	0.2	0.15	0.8						
	0.6	0.0	0.10	0.1						
	-	0.0								
	0.9	0.3	0.15	0.1						
NO. 5	3.2	0.2	0.25	0.8						
	1.2	0.1	0.15	0.2						
NO. 5+0.8	-				0.0					
	0.6				0.4	0.20	0.1			
	0.8				0.4	0.40	0.3			
	0.8				0.0	0.20	0.2			
	-	0.8								
EC. 2	1.1	0.8	0.80	0.9						
	14.5	1.0	0.90	13.1						
	1.0	0.0	0.50	0.5						
小計	35.3			0.0			39.6			

[illegible]

擁壁工集計表

[illegible]

1 号 重 力 式 擁 壁 集 計 表


測 点	延長	コンクリート	型枠	基礎碎石	基礎碎石		水抜パイプ	吸出	目地材	前面足場	背面足場
		σck=18N	小型	RC-40	t=15cm		VUφ150	防止材	t=10mm	単管足場	傾斜足場
NO. 0+0.7~NO. 0-0.7	2.2	0.9	3.8	2.0	0.3		0.0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	m 2.2	m3 0.9	m2 3.8	m2 2.0	m3 0.3		m 0.0	枚 0	m2 0.0	掛m2 0.0	掛m2 0.0

計第 12 表

芝台ブロック

数量計算書

[illegible]

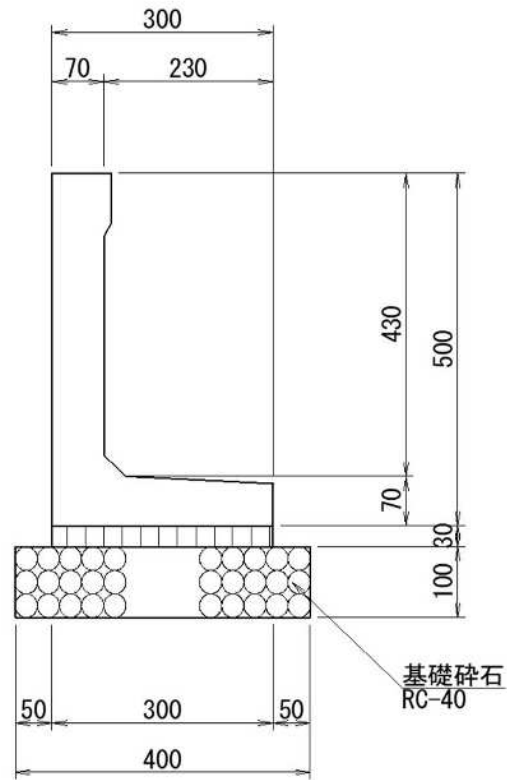

計第 12 表		芝台ブロック		1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
基礎碎石	RC-40	0.40*10.0	4.000	27.700	11.080	m2
基礎碎石	t=10cm	0.40*0.10*10.0	0.400	27.700	1.108	m3
敷モルタル	1：3	0.30*0.03*10.0	0.090	27.700	0.249	m3
芝台ブロック	H500型	10.0/0.60	16.600	27.700	45.982	個

ブロック積工 集計表

[illegible]

ブロック積擁壁工 集 計 表

測 点	延 長	ブ ロ ッ ク 積	胴 込 コ ン	裏 込 コ ン	裏 込 砕 石	水 抜 パ イ プ	吸 出 防 止 材	目 地 材	基 礎 工	天 端 コ ン ク リ ー ト	
		控 長 35cm	σ c k = 18N	σ c k = 18N	R C - 40	V U φ 150		t = 10mm			
NO. 0+2. 3 ~ NO. 0+15. 2	12. 9	19. 9	4. 4	2. 0	5. 6	1. 0	2. 0	0. 0	12. 9	12. 9	
NO. 0+6. 82 ~ NO. 1+1. 7	15. 7	22. 8	5. 0	2. 3	5. 9	1. 4	3. 0	0. 7	15. 4	16. 0	
合 計	m 28. 5	m2 42. 7	m3 9. 4	m3 4. 3	m3 11. 5	m 2. 4	枚 5. 0	m2 0. 7	m 28. 2	m 28. 8	

計第 14 表					ブロック積擁壁工			数 量 計 算 書					
測 点 距 離	積ブロック（控35cm）			裏 込 砕 石			基 礎 工						摘 要
	SL	平 均 平 積		断 面 平 均 立 積					延 長				
NO. 0+2. 3	-	2. 2			0. 64					-			
NO. 0+6. 82	4. 5	2. 1	2. 15	9. 6	0. 63	0. 64	2. 9			4. 5			
NO. 0+15. 2	8. 4	0. 3	1. 23	10. 3	0. 00	0. 32	2. 7			8. 4			
合 計	12. 9m			19. 9m ²			5. 6m ³			12. 9m			
測 点 距 離	擁壁平均高						天端コンクリート						摘 要
	擁 壁 高	平 均 平 均 高							延 長				
NO. 0+2. 3	-	2. 01							-				
NO. 0+6. 82	4. 5	1. 98	1. 995						4. 5				
NO. 0+15. 2	8. 4	0. 30	1. 140						8. 4				
合 計	12. 9m								12. 9m				
胴 込 コン ク リ ー ト		ブ ロ ッ ク 積 平 積 × 0. 22				V1=19. 9×0. 22			4. 4 m ³				
裏 込 コン ク リ ー ト		ブ ロ ッ ク 積 平 積 × 裏 込 コ ン ク リ ー ト 厚				V2=19. 9×0. 10			2. 0 m ³				
水 抜 パ イ プ	種 別	算 出 根 拠			算 式			数 量	単 位				
	設 置 対 象 面 積	A=ブ ロ ッ ク 積 平 積 - (控 除 高 × 法 面 勾 配 斜 率 × 延 長)			A=19. 9- (0. 30×1.								


計第 14 表					ブロック積擁壁工				数 量 計 算 書					
測 点	距 離	積ブロック (控35cm)			裏 込 砕 石			基 礎 工						摘 要
		SL	平 均	平 積	断 面	平 均	立 積			延 長				
NO. 0+6. 82	-	0. 3			0. 00					-				
NO. 0+15. 2	8. 4	2. 1	1. 20	10. 1	0. 60	0. 30	2. 5			8. 4				
	3. 9	2. 0	2. 06	8. 1	0. 58	0. 59	2. 3			3. 8	(4. 09+3. 77) /2=		3. 9	
	0. 4	2. 0	2. 04	0. 7	0. 58	0. 58	0. 2			0. 2	(0. 48+0. 21) /2=		0. 4	
	3. 0	0. 5	1. 29	3. 9	0. 01	0. 30	0. 9			3. 0				
合 計	15. 7	m		22. 8	m2		5. 9	m3		15. 4	m			
測 点	距 離	擁壁平均高						天端コンクリート						摘 要
		擁 壁 高	平 均	平 均 高						延 長				
NO. 0+6. 82	-	0. 30								-				
NO. 0+15. 2	8. 4	1. 92	1. 110							8. 4				
	3. 9	1. 89	1. 905							4. 1				
	0. 4	1. 89	1. 890							0. 5				
	3. 0	0. 50	1. 195							3. 0				
合 計	15. 7	m								16. 0	m			
胴 込 コ ン ク リ ー ト		ブ ロ ッ ク 積 平 積 × 0. 22				V1=22. 8×0. 22			5. 0			m3		
裏 込 コ ン ク リ ー ト		ブ ロ ッ ク 積 平 積 × 裏 込 コ ン ク リ ー ト 厚				V2=22. 8×0. 10			2. 3			m3		
水 抜 パ イ プ	種 別	算 出 根 拠				算 式				数 量	単 位			
	設 置 対 象 面 積	A=ブ ロ ッ ク 積 平 積 - (控 除 高 × 法 面 勾 配 斜 率 × 延 長)				A=22. 8- (0. 30×1. 077×15. 67)				17. 7	m2			
	設 置 箇 所 数	n=水 抜 パ イ プ 設 置 対 象 面 積 ÷ 水 抜 パ イ プ 設 置 箇 所				n=17. 7÷7				3	箇 所			
	水 抜 パ イ プ 一 本 長	l= (ブ ロ ッ ク 控 長 + 裏 込 コ ン ク リ ー ト 厚) × 法 面 勾 配 斜 率				l= (0. 35+0. 10) ×1. 077				0. 48	m			
	吸 出 防 止 材 枚 数	N=水 抜 パ イ プ 設 置 対 象 面 積 ÷ 水 抜 パ イ プ 設 置 箇 所				N=17. 7÷7				3	枚			
	水 抜 パ イ プ 延 長	L=水 抜 パ イ プ 一 本 長 × 吸 出 防 止 材 枚 数				L=0. 48×3				1. 44	m			
目 地 材	種 別	算 出 根 拠				算 式				数 量	単 位			
	平 均 断 面 積	a=ブ ロ ッ ク 積 平 積 ÷ 延 長 × (控 長 + 裏 込 コ ン 厚)				a=22. 8÷15. 67× (0. 35+0. 10)				0. 65	m2			
	目 地 材 設 置 箇 所 数	N=延 長 ÷ 目 地 材 設 置 箇 所 - 1				N=15. 67÷10- 1				1	箇 所			
	目 地 材 面 積	A=平 均 断 面 積 × 目 地 材 設 置 箇 所 数				A=0. 65×1				0. 7	m2			

計第 15 表

ブロック積基礎工

数量計算書

左			右		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
			N0. 0+2. 3～N0. 0+15. 2	12. 9	
			N0. 0+6. 82～N0. 1+1. 7	15. 4	
左側合計			右側合計		
0.0 m			28.3 m		
			合 計		
			28.3 m		

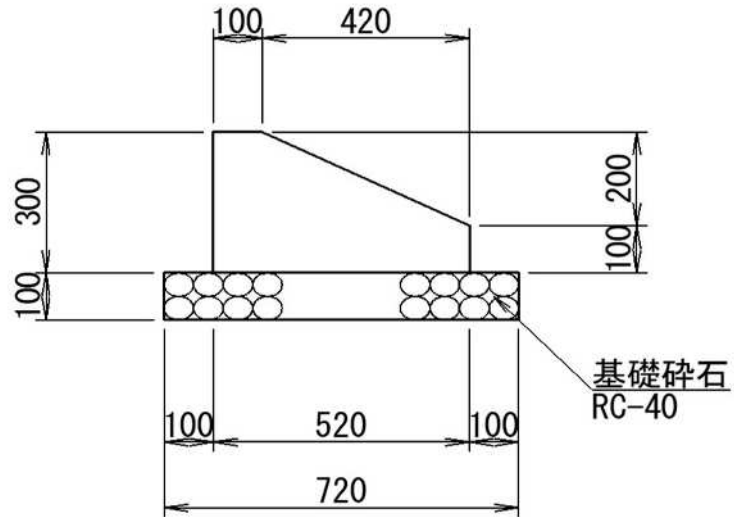

計第 15 表		ブロック積基礎工		1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(1/2 \times (0.10 + 0.52) \times 0.20 + 0.52 \times 0.10) \times 10.0$	1.140	28.300	3.226	m ³
型枠	小型構造物	$(0.30 + 0.10) \times 10.0$	4.000	28.300	11.320	m ²
基礎碎石	RC-40	0.72×10.0	7.200	28.300	20.376	m ²
基礎碎石	t=10cm	$0.72 \times 0.10 \times 10.0$	0.720	28.300	2.038	m ³

計第 16 表

天端コンクリート工 数量計算書

[illegible]

排水構造物工 集 計 表

種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
作業土工				
床掘	標準（砂質土）	m3	23.2	
埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	0.0	
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	15.8	
基面整正	（砂質土）	m2	30.4	
側溝工				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝	1号L型側溝	m	0.0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	36.1	
〃	PU3-B300-H400	m	10.1	
側溝蓋	PC4-B300	枚	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	角フリューム	m	0.0	
場所打水路工				
現場打水路	1号U型側溝	m	0.0	
〃	2号U型側溝	m	0.0	
〃	3号U型側溝	m	9.2	
〃	4号U型側溝	m	2.4	
管渠工				
管渠	PVC-150	m	13.9	
〃	PVC-250	m	6.3	
〃	PVC-600	m	0.0	
〃	塩ビ管(VUφ150)	m	5.3	
集水樹工				
集水樹	取水工	箇所	1	
〃	落水工	箇所	0	
〃	呑口工	箇所	0	
〃	吐口工	箇所	1	
〃	1号集水樹	箇所	3	
〃	2号集水樹	箇所	0	
〃	3号集水樹	箇所	0	
〃	4号集水樹	箇所	0	
〃	5号集水樹	箇所	0	

排水構造物作業土工 集 計 表

種 別	床掘	埋戻			基面整正				
	E (S)	FuC	FuD	FuD (C)	K (S)				
左側	14.1		9.3		20.7				
中央	7.0		4.9		5.4				
右側①	2.1		1.6		4.3				
右側②	0.0	0.0			0.0				
合 計	m3 23.2	m3 0.0	m3 15.8		m2 30.4				

[illegible]

[illegible]


[illegible]

計第 22 表

PU3-B300-H300

数量計算書

左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
NO. 1+5. 0～NO. 1+14. 6	9. 6		NO. 5+3. 7～NO. 6+5. 5	0. 0	
NO. 1+15. 4～NO. 2+10. 6	15. 3		NO. 6+6. 5～NO. 7+1. 9	0. 0	
NO. 2+11. 4～NO. 3+2. 5	11. 2		NO. 7+2. 8～NO. 7+11. 3	0. 0	
NO. 3+3. 5～NO. 4+6. 5	0. 0		NO. 7+12. 3～NO. 12+16. 1	0. 0	
左側合計	36. 1 m		右側合計	0. 0 m	
			合 計	36. 1 m	

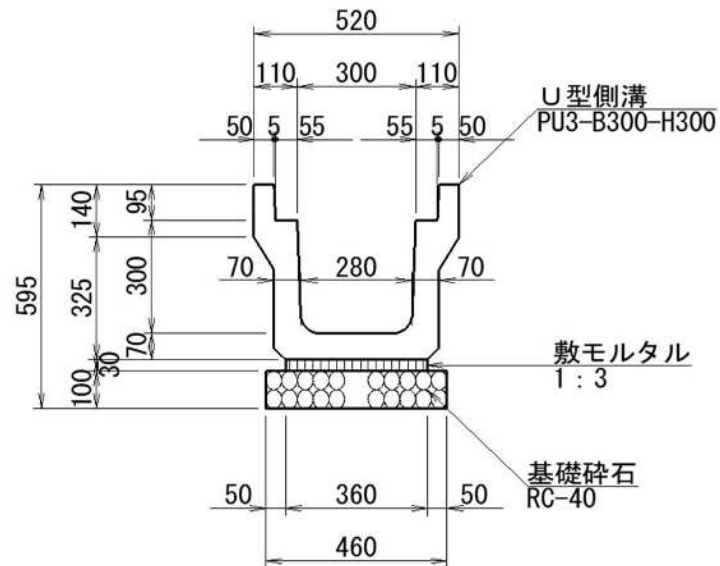


計第 22 表		PU3-B300-H300		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
基礎碎石	RC-40	広島県制定土木構造物標準設計図集より	4.600	36.100	16.606	m2
基礎碎石	t=10cm	〃	0.460	36.100	1.661	m3
敷モルタル	1：3	〃	0.108	36.100	0.390	m3
目地モルタル	1：2	〃	0.002	36.100	0.007	m3
U型側溝	PU3-B300-H300	〃	5.000	36.100	18.050	個

計第 23 表

PU3-B300-H400

数量計算書

左			側			右			側				
測		点	延	長	備	考	測		点	延	長	備	考
		NO. 0+14. 9～NO. 1+5. 0		10. 1									

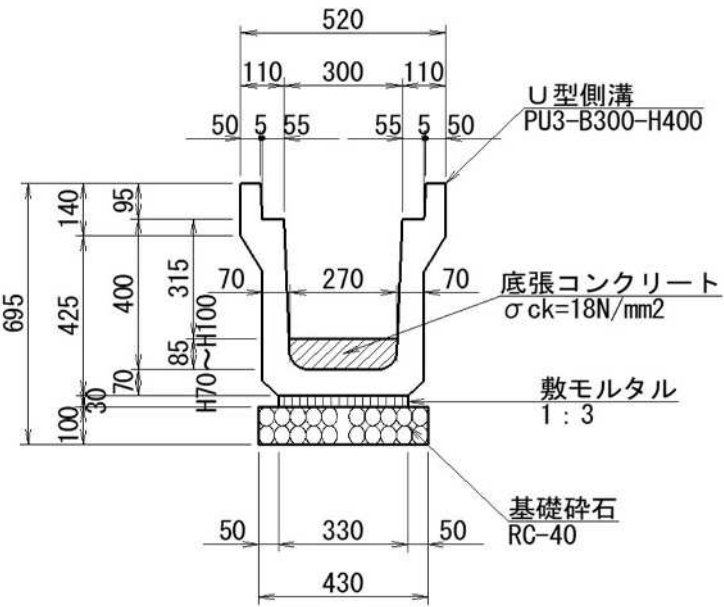


計第 23 表		PU3-B300-H400		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
基礎碎石	RC-40	広島県制定土木構造物標準設計図集より	4.300	10.100	4.343	m2
基礎碎石	t=10cm	〃	0.430	10.100	0.434	m3
敷モルタル	1 : 3	〃	0.099	10.100	0.100	m3
目地モルタル	1 : 2	〃	0.002	10.100	0.002	m3
U型側溝	PU3-B300-H300	〃	5.000	10.100	5.050	個
底張コンクリート	σck=18N/mm2	0.27*0.085*10.0	0.230	10.100	0.232	m3

計第 28 表

3号U型側溝

数量計算書

左			側			右			側				
測		点	延	長	備	考	測		点	延	長	備	考
		NO. 0+5. 4～NO. 0+14. 1		9. 2									

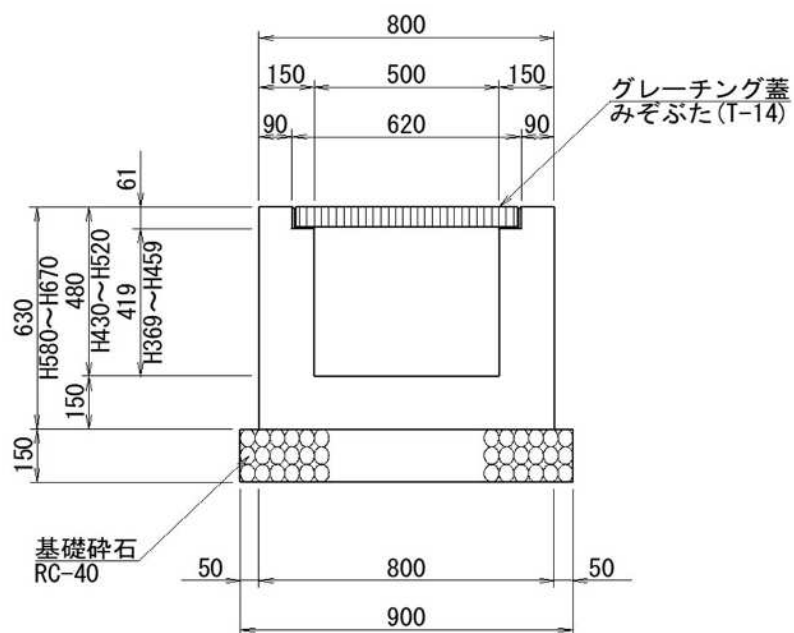


計第 28 表		3号U型側溝		1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
コンク リート	σ ck=18N/mm2	(0.80*0.63-0.62*0.061-0.50*0.419)*10.0	2.567	9.200	2.361	m3
型枠	小型構造物	(0.63*4-0.061*2)*10.0	23.980	9.200	22.062	m2
基礎砕石	RC-40	0.90*10.0	9.000	9.200	8.280	m2
基礎砕石	t=15cm	0.90*0.15*10.0	1.350	9.200	1.242	m3
グ レーチング 蓋	みぞぶた B500 (T-14)	10.0/1.00	10.000	9.200	9.200	枚

計第 29 表

4号U型側溝

数量計算書

左			右		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
			N0. 0+2. 8付近	2. 4	
左側合計	0.0 m		右侧合計	2.4 m	
			合計	2.4 m	

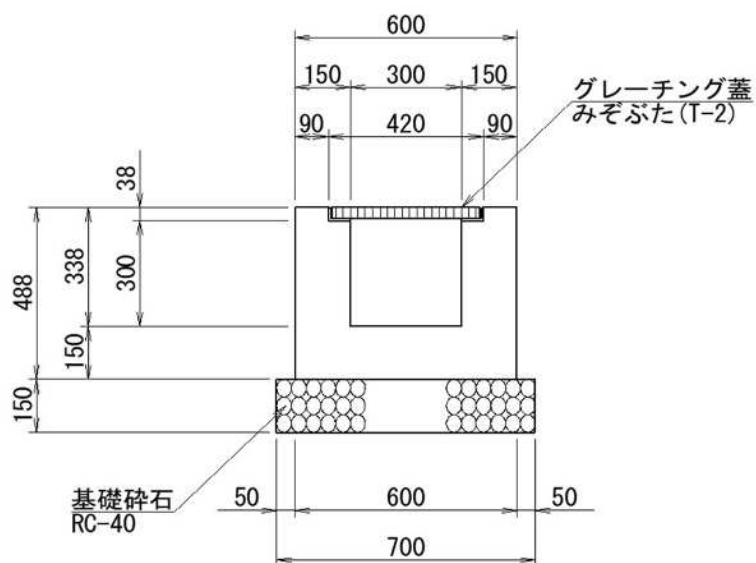


計第 29 表		4号U型側溝		1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.60 \times 0.488 - 0.42 \times 0.038 - 0.30 \times 0.30) \times 10.0$	1.868	2.400	0.448	m ³
型枠	小型構造物	$(0.488 \times 4 - 0.038 \times 2) \times 10.0$	18.760	2.400	4.502	m ²
基礎碎石	RC-40	0.70×10.0	7.000	2.400	1.680	m ²
基礎碎石	t=15cm	$0.70 \times 0.15 \times 10.0$	1.050	2.400	0.252	m ³
グレーチング蓋	みぞぶた B300(T-2)	10.0/1.00	10.000	2.400	2.400	枚

計第 30 表

PVC-150

数量計算書

左			右		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
			N0. 0+15. 6付近	7. 7	
			N0. 2+11. 0付近	6. 2	
左側合計	0.0 m		右側合計	13.9 m	
			合計	13.9 m	

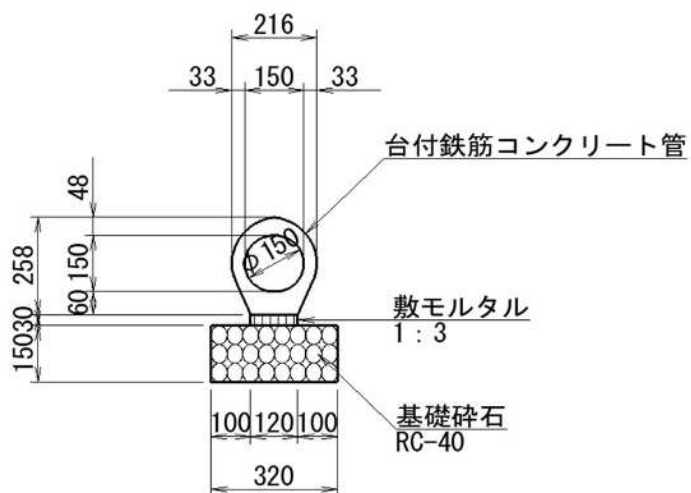


計第 30 表		PVC-150		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
基礎碎石	RC-40	0.32*10.0	3.200	13.900	4.448	m2
基礎碎石	t=15cm	0.32*0.15*10.0	0.480	13.900	0.667	m3
敷モルタル	1 : 3	0.12*0.03*10.0	0.036	13.900	0.050	m3
台付鉄筋 コンクリート管	φ150 L=1000	10.0/1.00	10.000	13.900	13.900	本

計第 31 表

PVC-250

数量計算書

左			右		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
			N0. 1+14. 9付近	6. 3	
			N0. 7+2. 3付近	0. 0	
左側合計	0.0 m		右側合計	6.3 m	
			合計	6.3 m	

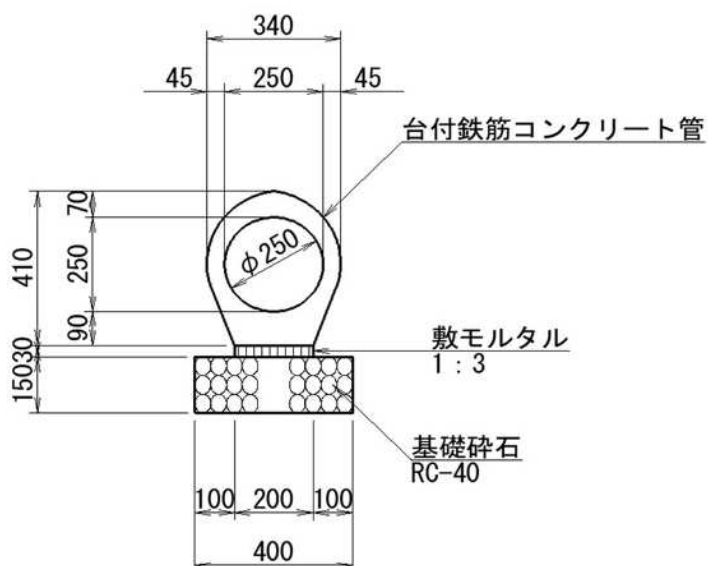

計第 31 表		PVC-250		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
基礎碎石	RC-40	0.32*10.0	4.000	6.300	2.520	m2
基礎碎石	t=15cm	0.40*0.15*10.0	0.600	6.300	0.378	m3
敷モルタル	1 : 3	0.20*0.03*10.0	0.060	6.300	0.038	m3
台付鉄筋 コンクリート管	φ 250 L = 2000	10.0/2.00	5.000	6.300	3.150	本

計第 33 表

塩ビ管

数 量 計 算 書


左 側			右 側		
測 点	延 長	備 考	測 点	延 長	備 考
N0. 0+14. 5	2. 4	1-3号集水桝	N0. 0+2. 8	1. 3	4号U型側溝
N0. 3+3. 0	1. 6	取水工	N0. 5+ 5. 8	0. 0	落水工
			N0. 6+6. 0	0. 0	取水工
			N0. 7	0. 0	落水工
			N0. 7+11. 8	0. 0	取水工
			BC. 4	0. 0	落水工
左 側 合 計	4. 0 m		右 側 合 計	1. 3 m	
			合 計	5. 3 m	

計第 34 表

取水工

数量計算書

左側			右側		
測点	箇所	備考	測点	箇所	備考
NO. 3+3.0	1		NO. 6+6.0	0	
			NO. 7+11.8	0	
左側合計	1 箇所		右側合計	0 箇所	
			合 計	1 箇所	

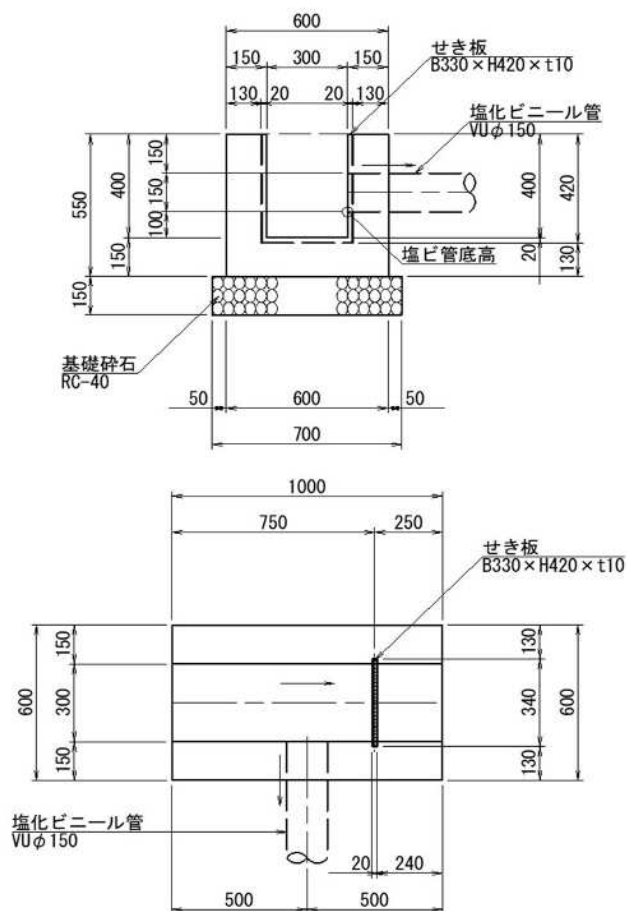


計第 34 表		取水工		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	1 箇所 当り数量	箇 所	数 量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.60 \times 0.55 - 0.30 \times 0.40) \times 1.00 - 1/4 \times \pi \times 0.15 \times 0.15 \times 0.15$	0.207	1.000	0.207	m3
型枠	小型構造物	$(0.60 \times 0.55 - 0.30 \times 0.40) \times 2 + 0.55 \times 4 \times 1.00 - 1/4 \times \pi \times 0.15 \times 0.15 \times 2$	2.585	1.000	2.585	m2
基礎砕石	RC-40	0.70×1.00	0.700	1.000	0.700	m2
基礎砕石	t=15cm	$0.70 \times 0.15 \times 1.00$	0.105	1.000	0.105	m3
せき板	B330×H420 × t10		1.000	1.000	1.000	枚

計第 37 表

吐口工

数量計算書

左			側		右			側	
測	点	箇所	備	考	測	点	箇所	備	考
	NO. 7+2.3	0				NO. 1+15.0	1		
									</

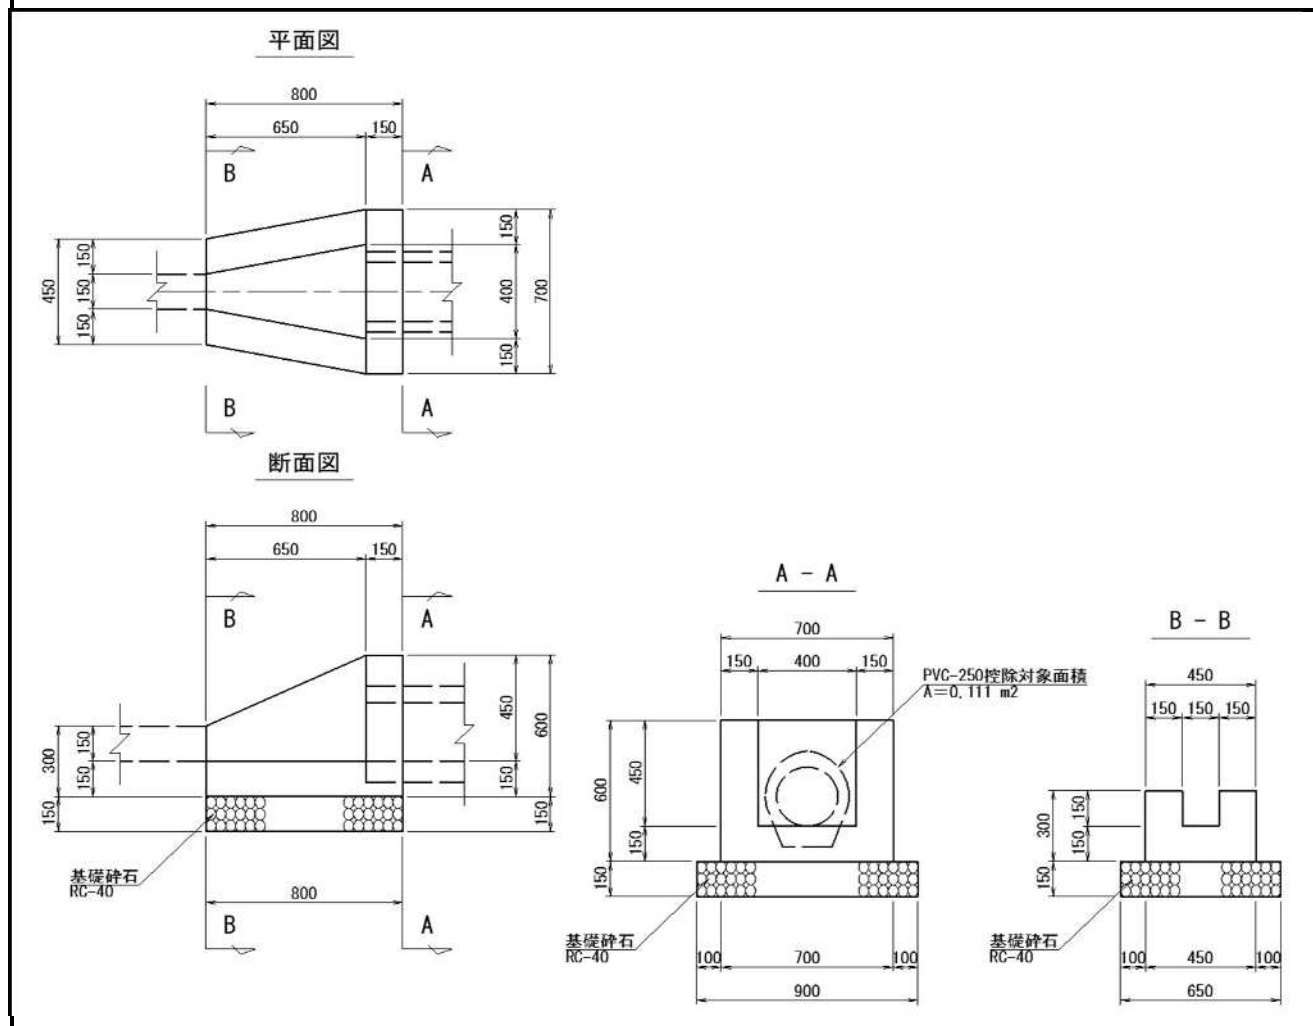


計第 37 表		吐口工		1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	1箇所 当り数量	箇 所 数	数 量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.70 \times 0.60 - 0.40 \times 0.45 + 0.45 \times 0.30 - 0.15 \times 0.15) \times 0.65 + 0.70 \times 0.60 \times 0.15 - 0.111 \times 0.15$	0.161	1.000	0.161	m ³
型枠	小型構造物	$1/2 \times (0.60 \times 4 + 0.30 \times 4) \times 0.65 + 0.70 \times 0.60 \times 2 + 0.15 \times 0.60 \times 2 - 0.111 \times 2 + 0.45 \times 0.30 - 0.15 \times 0.15$	2.081	1.000	2.081	m ²
基礎碎石	RC-40	$1/2 \times (0.90 + 0.65) \times 0.80$	0.620	1.000	0.620	m ²
基礎碎石	t=15cm	$1/2 \times (0.90 + 0.65) \times 0.80 \times 0.15$	0.093	1.000	0.093	m ³

計第 38 表

1 号集水枰


数量計算書

左側			右側		
測点	箇所	備考	測点	箇所	備考
NO. 0+14.5	1	1-3号集水桝			
NO. 1+15.0	1	1-1号集水桝			
NO. 2+11.0	1	1-2号集水桝			
左側合計	3箇所		右側合計	0箇所	
			合 計	3箇所	

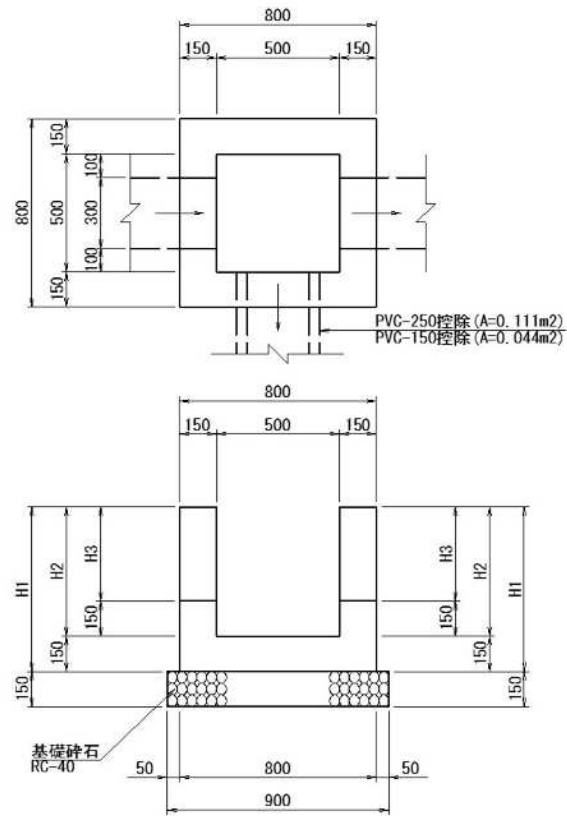

種 別	H1	H2	H3	PVC
1-1号集水樹	700	550	400	φ 250
1-2号集水樹	700	550	400	φ 150
1-3号集水樹	730	580	430	φ 150

計第 38 表		1-1号集水樹		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	1 箇所 当り数量	箇 所	数 量	単位
コンク リート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.70 - 0.50 \times 0.50 \times 0.55 - 0.30 \times 0.40 \times 0.15 \times 2 - 0.111 \times 0.15$	0.258	1.000	0.258	m3
型 枠	小型構造物	$0.80 \times 0.70 \times 4 + 0.50 \times 0.70 \times 4 + 0.15 \times 0.40 \times 4 - 0.111 \times 2$	3.658	1.000	3.658	m2
基礎碎石	RC-40	0.90×0.90	0.810	1.000	0.810	m2
基礎碎石	t=15cm	$0.90 \times 0.90 \times 0.15$	0.122	1.000	0.122	m3

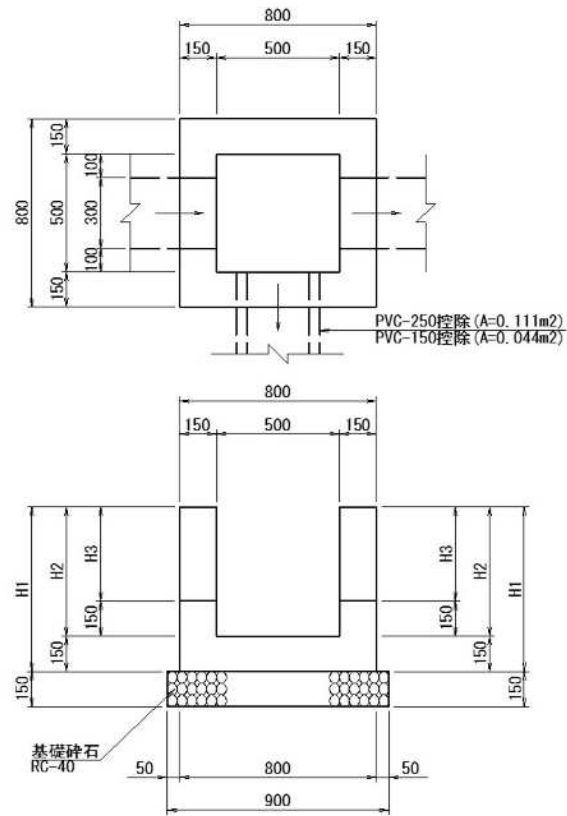


種 別	H1	H2	H3	PVC
1-1号集水樹	700	550	400	φ 250
1-2号集水樹	700	550	400	φ 150
1-3号集水樹	730	580	430	φ 150

計第 38 表

1-2号集水樹

1箇所当たり

名 称	規 格	計 算 式	1箇所 当り数量	箇 所	数 量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.70 - 0.50 \times 0.50 \times 0.55 - 0.30 \times 0.40 \times 0.15 - 0.044 \times 0.15$	0.268	1.000	0.268	m ³
型枠	小型構造物	$0.80 \times 0.70 \times 4 + 0.50 \times 0.70 \times 4 + 0.15 \times 0.40 \times 4 - 0.044 \times 2$	3.792	1.000	3.792	m ²
基礎碎石	RC-40	0.90×0.90	0.810	1.000	0.810	m ²
基礎碎石	t=15cm	$0.90 \times 0.90 \times 0.15$	0.122	1.000	0.122	m ³

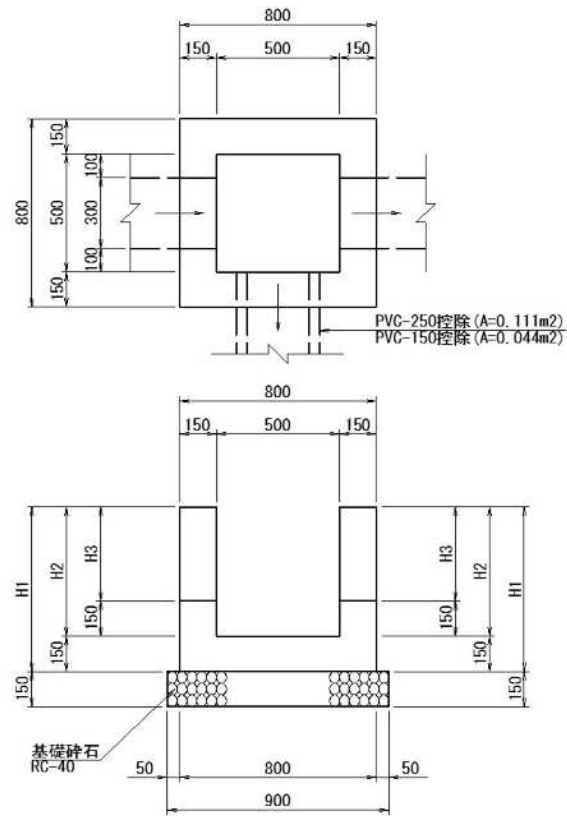

種 別	H1	H2	H3	PVC
1-1号集水樹	700	550	400	φ 250
1-2号集水樹	700	550	400	φ 150
1-3号集水樹	730	580	430	φ 150

計第 38 表

1-3号集水樹

1箇所当たり

名 称	規 格	計 算 式	1箇所 当り数量	箇 所	数 量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.73 - 0.50 \times 0.50 \times 0.58 - 0.30 \times 0.43 \times 0.15 \times 2 - 0.044 \times 0.15$	0.277	1.000	0.277	m ³
型枠	小型構造物	$0.80 \times 0.73 \times 4 + 0.50 \times 0.73 \times 4 + 0.15 \times 0.43 \times 4 - 0.044 \times 2$	3.966	1.000	3.966	m ²
基礎碎石	RC-40	0.90×0.90	0.810	1.000	0.810	m ²
基礎碎石	t=15cm	$0.90 \times 0.90 \times 0.15$	0.122	1.000	0.122	m ³

構造物撤去工 集 計 表

[illegible]

コンクリート構造物取壊し

集 計 表

種 別	CoBr							
本線（水路・管渠）	3.6							
現場打ち水路	0.0							
管渠	0.3							
呑口工	0.5							
呑口工・吐口工	0.2							
集水桝 (B600-L600-H500)	0.3							
集水桝 (B800-L800-H600)	0.0							
集水桝 (B1000-L1000-H1000)	0.0							
	m3							
	4.9							

[illegible]



計第 43 表		コンクリート構造物取壊し			数 量 計 算 書					
測 点	距 離 (m)	CoBr								
			平 均	立積 (m3)						
	-	0.07								
SP. 4	4.5	0.07	0.070	0.32						
NO. 9	5.3	0.07	0.070	0.37						
EC. 4	12.3	0.07	0.070	0.86						
NO. 10	9.2	0.07	0.070	0.64						
	2.2	0.07	0.070	0.15						
SP. 4	-	0.03								
NO. 9	4.3	0.03	0.030	0.13						
EC. 4	11.2	0.03	0.030	0.34						
NO. 10	9.2	0.03	0.030	0.28						
	1.5	0.03	0.030	0.05						
	-	0.04								
IP. 5	9.6	0.04	0.040	0.38						
	0.4	0.04	0.040	0.02						
	-	0.05								
NO. 11	8.6	0.05	0.050	0.43						
BC. 6	15.6	0.09	0.070	1.09						
NO. 12	4.4	0.09	0.090	0.40						
SP. 6	4.1	0.09	0.090	0.37						
EC. 6	8.6	0.08	0.085	0.73						
	3.6	0.08	0.080	0.29						
	-	0.05								
H-1	0.6	0.05	0.050	0.03						
	6.9	0.05	0.050	0.35						
H-1	-	0.03								
	15.1	0.03	0.030	0.45						
	-	0.03								
H-3	8.3	0.03	0.030	0.25						
	6.5	0.03	0.030	0.20						
	-	0.02								
H-3	5.6	0.02	0.020	0.11						
合 計	96.5			3.62						

計第 45 表

管渠

数量計算書

[illegible]

管渠		単位材料 数量計算書	計第 45 表
$\phi 150$ S=1:20 $\phi 250$ S=1:20 $\phi 600$ S=1:20   			

計第 45 表		管渠	1 箇所当たり			
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
$\phi 150$ コンクリート	無筋構造物	$(1/4 * \pi * 0.202 * 0.202 - 1/4 * \pi * 0.15 * 0.15) * 10.0$	0.144	9.200	0.132	m3
$\phi 250$ コンクリート	無筋構造物	$(1/4 * \pi * 0.306 * 0.306 - 1/4 * \pi * 0.25 * 0.25) * 10.0$	0.245	5.100	0.125	m3
$\phi 600$ コンクリート	無筋構造物	$(1/4 * \pi * 0.70 * 0.70 - 1/4 * \pi * 0.60 * 0.60) * 10.0$	1.021	0.000	0.000	m3
コンクリート 合計	無筋構造物				0.257	m3

計第 46 表

吞口工

数量計算書


左側			右側		
測点	箇所	備考	測点	箇所	備考
NO. 2+15.3	1		NO. 10+3.2	0	
NO. 3+1.1	0				
左側合計	1箇所		右側合計	0箇所	
			合 計	1箇所	

計第 47 表

呑口工・吐口工

数量計算書

左側			右側		
測 点	箇 所	備 考	測 点	箇 所	備 考
NO. 4+14. 6	0		NO. 1+15. 0	1	
NO. 7+2. 3	0		NO. 5+17. 4	0	
			NO. 6+2. 5	0	
			NO. 7+4. 7	0	
			NO. 7+9. 6	0	
左 側 合 計	0 箇所		右 側 合 計	1 箇所	
			合 計	1 箇所	

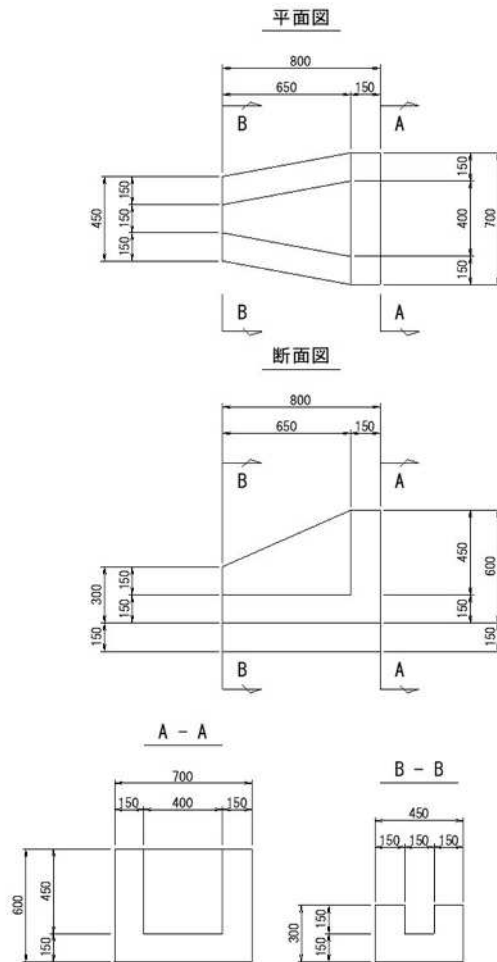

計第 47 表

吞口工・吐口工

1箇所当たり

[illegible]

計第 48 表

B600-L600-H500

数量計算書

左側			右側		
測点	箇所	備考	測点	箇所	備考
NO. 0+5.8	1		NO. 7+2.3	0	
NO. 4+10.5	0		NO. 12+16.5	0	
左側合計	1箇所		右側合計	0箇所	
			合計	1箇所	

数量計算書

[illegible]

舗装切断B

数量計算書

左		側		右		側					
測	点	延	長	備	考	測	点	延	長	備	考
							H-1~H-3付近	27.9			
左	側	合	計	0.0	m	右	側	合	計	27.9	m
							合	計	27.9	m	


計第 51 表

舗装版取壊し

数 量 計 算 書

測 点	距 離 (m)	W1'			W2'					
		幅	平 均	平積 (m2)	幅	平 均	平積 (m2)			
起点付近	0.5		27.9	13.95						
NO. 0	—	5.4								
NO. 0+6.82	6.8	3.6	4.50	30.6						
NO. 1	13.2	3.1	3.35	44.2						
NO. 1+5.0	5.0	3.1	3.10	15.5						
NO. 1+15.0	10.0	3.2	3.15	31.5						
NO. 2	5.0	3.0	3.10	15.5						
BC. 1	3.5	3.3	3.15	11.0						
SP. 1	14.8	2.8	3.05	45.1						
EC. 1	14.8	3.3	3.05	45.1						
BC. 2	6.4	3.0	3.15	20.2						
SP. 2	11.7	3.5	3.25	38.0						
NO. 5	8.9	3.0	3.25	28.9						
EC. 2	2.8	3.0	3.00	8.4						
NO. 6	17.2	3.1	3.05	52.5						
BC. 3	3.0	3.1	3.10	9.3						
SP. 3	12.3	3.2	3.15	38.7						
NO. 7	4.7	3.2	3.20	15.0						
EC. 3	7.6	3.2	3.20	24.3						
BC. 4	14.0	3.3	3.25	45.5						
SP. 4	14.6	3.4	3.35	48.9						
NO. 9	3.8	3.5	3.45	13.1						
EC. 4	10.8	3.3	3.40	36.7						
NO. 10	9.2	3.2	3.25	29.9						
IP. 5	11.0	4.2	3.70	40.7						
NO. 11	9.0	3.3	3.75	33.8						
BC. 6	15.6	3.1	3.20	49.9						
NO. 12	4.4	3.1	3.10	13.6						
SP. 6	4.1	3.1	3.10	12.7						
EC. 6	8.6	3.2	3.15	27.1						
	1.2	3.2	3.20	3.8						
	2.3	0.0	1.60	3.7						
H-1							27.4			
H-3							13.0			
							25.5			
NO. 10~IP. 5				28.6						
合 計				193.4			65.9			

工 種	側溝撤去		数 量 計 算 書		
測 点	H-1付近(国道右側)	延 長	7.5 m		
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延 長	数 量
コンクリート	無筋構造物	$\frac{(0.40+0.38)}{2} \times 0.32 + \frac{(0.38+0.30)}{2} \times 0.04 - \frac{(0.30+0.26)}{2} \times 0.30$	0.054 m ³	7.5 m	0.4 m ³

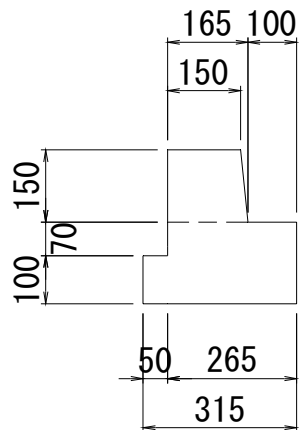工 種	緑石撤去 数 量 計 算 書				
測 点	H-3付近(国道左側)	延 長	6.9 m		
					
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延 長	数 量
コンクリート	無筋構造物	$(0.15+0.165)/2*0.15+0.265*0.07+0.315*0.10$	0.074 m³	6.9 m	0.6 m³
					

舖 裝 工 集 計 表

[illegible]

計第 52 表

車道舗装

数 量 計 算 書

測 点	距 離 (m)	表 層			上 層 路 盤			下 層 路 盤		
		幅	平 均	平積(m2)	幅	平 均	平積(m2)	幅	平 均	平積(m2)
NO. 1	-	6.50			6.60			6.70		
NO. 1+5.0	5.0	6.50	6.50	32.5	6.60	6.60	33.0	6.70	6.70	33.5
NO. 1+15.0	10.0	5.00	5.75	57.5	5.10	5.85	58.5	5.20	5.95	59.5
NO. 2	5.0	5.00	5.00	25.0	5.10	5.10	25.5	5.20	5.20	26.0
BC. 1	3.5	5.00	5.00	17.5	5.10	5.10	17.9	5.20	5.20	18.2
SP. 1	14.8	5.00	5.00	74.0	5.00	5.05	74.7	5.00	5.10	75.5
EC. 1	14.8	5.00	5.00	74.0	5.00	5.00	74.0	5.00	5.00	74.0
BC. 2	6.4	5.00	5.00	32.0	5.00	5.00	32.0	5.00	5.00	32.0
SP. 2	11.7	5.00	5.00	58.5	5.00	5.00	58.5	5.00	5.00	58.5
NO. 5	8.9	5.00	5.00	44.5	5.00	5.00	44.5	5.00	5.00	44.5
EC. 2	2.8	5.00	5.00	14.0	5.00	5.00	14.0	5.00	5.00	14.0
NO. 6	17.2	5.00	5.00	86.0	5.00	5.00	86.0	5.00	5.00	86.0
BC. 3	3.0	5.00	5.00	15.0	5.00	5.00	15.0	5.00	5.00	15.0
SP. 3	12.3	5.00	5.00	61.5	5.00	5.00	61.5	5.00	5.00	61.5
NO. 7	4.7	5.00	5.00	23.5	5.00	5.00	23.5	5.00	5.00	23.5
EC. 3	7.6	5.00	5.00	38.0	5.00	5.00	38.0	5.00	5.00	38.0
BC. 4	14.0	5.00	5.00	70.0	5.00	5.00	70.0	5.00	5.00	70.0
SP. 4	14.6	5.00	5.00	73.0	5.00	5.00	73.0	5.00	5.00	73.0
NO. 9	3.8	5.00	5.00	19.0	5.00	5.00	19.0	5.00	5.00	19.0
EC. 4	10.8	5.00	5.00	54.0	5.00	5.00	54.0	5.00	5.00	54.0
NO. 10	9.2	5.00	5.00	46.0	5.00	5.00	46.0	5.00	5.00	46.0
IP. 5	11.0	5.00	5.00	55.0	5.00	5.00	55.0	5.00	5.00	55.0
NO. 11	9.0	5.00	5.00	45.0	5.00	5.00	45.0	5.00	5.00	45.0
BC. 6	15.6	5.18	5.09	79.4	5.18	5.09	79.4	5.18	5.09	79.4
NO. 12	4.4	5.27	5.23	23.0	5.27	5.23	23.0	5.27	5.23	23.0
SP. 6	4.1	5.14	5.21	21.4	5.14	5.21	21.4	5.14	5.21	21.4
EC. 6	8.6	4.29	4.72	40.6	4.29	4.72	40.6	4.29	4.72	40.6
車道舗装①				167.7			167.7			167.7
車道舗装②				0.0			0.0			0.0
車道舗装③				0.0			0.0			0.0
U型控除				0.0			0.0			0.0
合 計	38.3			374.2			377.3			380.4



車道舗装

単位材料 数量計算書


計第 52 表

H-1


H-3

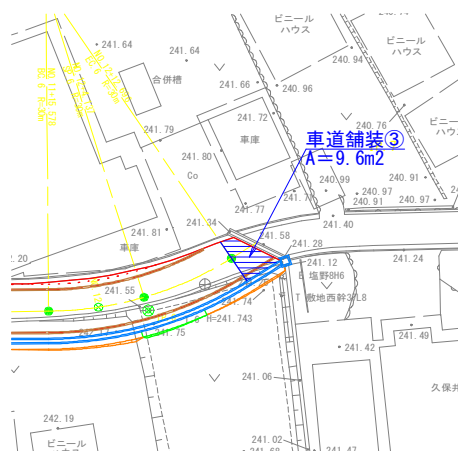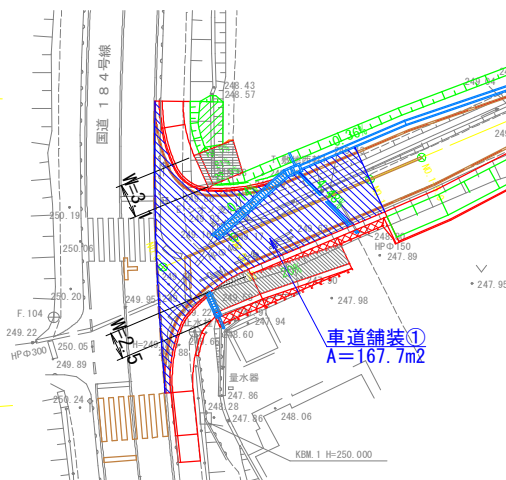


計第 52 表		車道舗装			1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式			1箇所 当り数量	箇 所 数	量 単 位
①	N0.0付近					167.70	m2
②	IP.5付近					0.00	m2
③	EC.6付近					0.00	m2
④	2号U型側溝 控除					0.00	m2
合計						167.70	m2

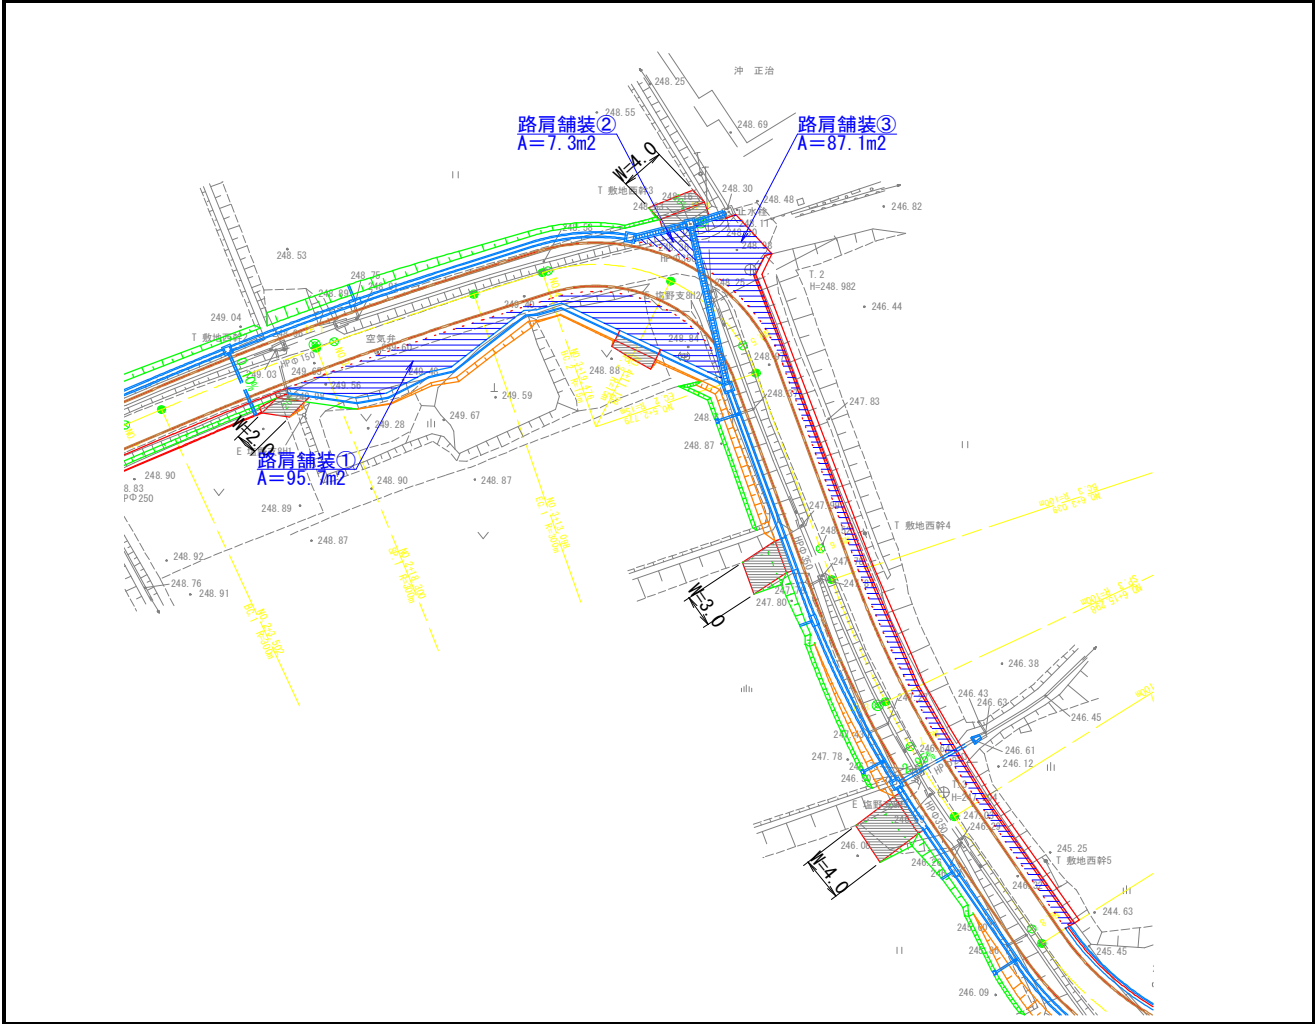

計第 53 表		路肩舗装			1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式			1箇所 当り数量	箇 所 数	量 単 位
①	N0.3付近 左側					28.00	m2
②	SP.1付近 右側					0.00	m2
③	N0.5付近 右側					0.00	m2
合計						28.00	m2



計第 54 表		歩道舗装		1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	1箇所 当り数量	箇 所	数 量	単位
①	H-1付近				14.50	m2
②	H-3付近				27.40	m2
県道左側	平面図より				13.00	m2
合計					54.90	m2

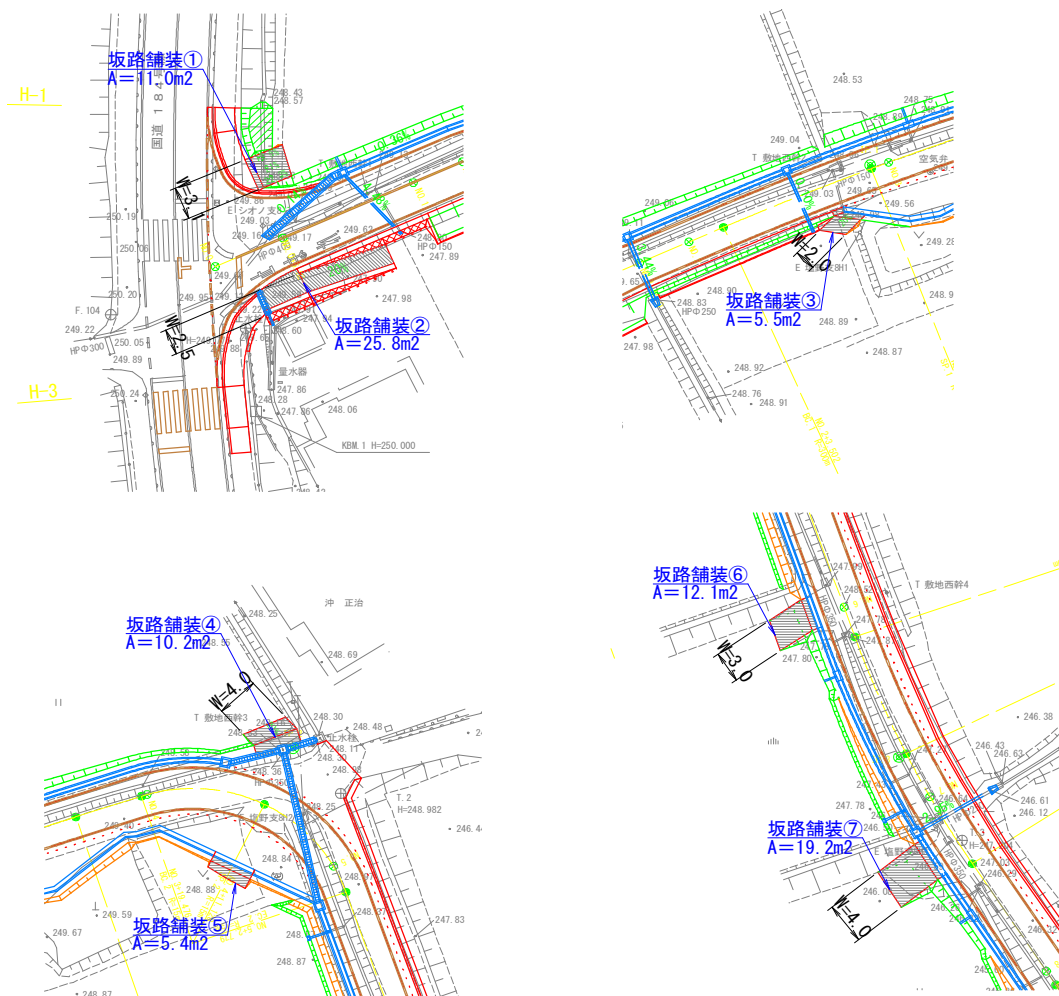

計第 55 表		坂路舗装			1箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式			1箇所 当り数量	箇 所 数	量 単 位
①	N0. 0+6. 82 左側					11. 00	m ²
②	N0. 0+6. 82 右側					25. 80	m ²
③	N0. 2+14. 0 右側					5. 50	m ²
④	N0. 4+10. 0 左側					0. 00	m ²
⑤	SP. 2 右側					0. 00	m ²
⑥	N0. 6 右側					0. 00	m ²
⑦	EC. 3 右側					0. 00	m ²
合計						42. 30	m ²

緣 石 工 集 計 表

[illegible]

計第 56 表

作業土工

数量計算書


[illegible]

計第 57 表

BB-M150

数量計算書

左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
			H-1付近	2.5	
			H-3付近	2.5	
			H-3付近	2.5	
左側合計			0.0 m		
右側合計			7.5 m		
合			計		
			7.5 m		

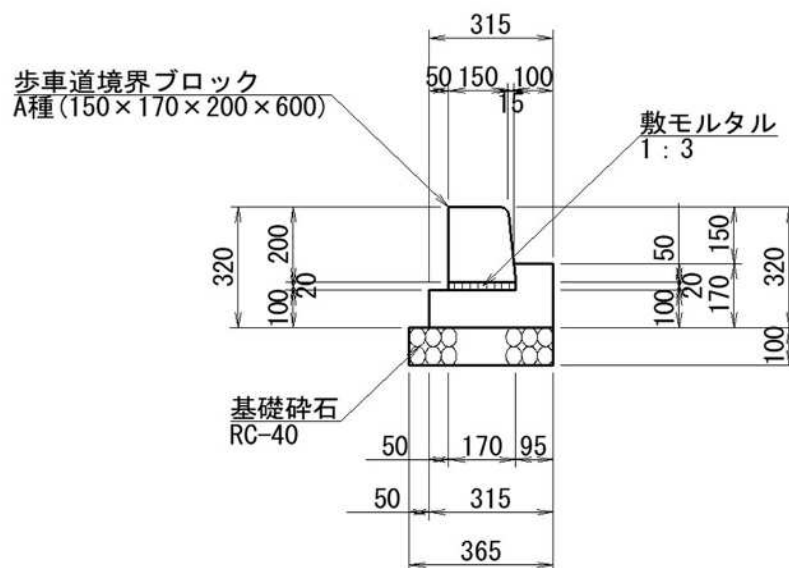


計第 57 表		BB-M150		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(1/2*(0.10+0.095)*0.07+0.315*0.10)*10.0$	0.383	7.500	0.287	m3
型枠	小型構造物	$(0.17+0.10)*10.0$	2.700	7.500	2.025	m2
基礎砕石	RC-40	$0.365*10.0$	3.650	7.500	2.738	m2
基礎砕石	t=10cm	$0.365*0.10*10.0$	0.365	7.500	0.274	m3
敷モルタル	1 : 3	$0.17*0.02*10.0$	0.034	7.500	0.026	m3
目地モルタル	1 : 2	$1/2*(0.15+0.17)*0.20*0.005*10.0/0.605$	0.003	7.500	0.002	m3
境界ブロック	A種(150×170×200×600)	$10.0/0.605$	16.500	7.500	12.375	個

計第 58 表

BB-E20

数量計算書

左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
			H-1付近	13.1	
			H-3付近	13.8	
			H-3付近	4.4	
左側合計	0.0 m		右側合計	31.3 m	
			合 計	31.3 m	

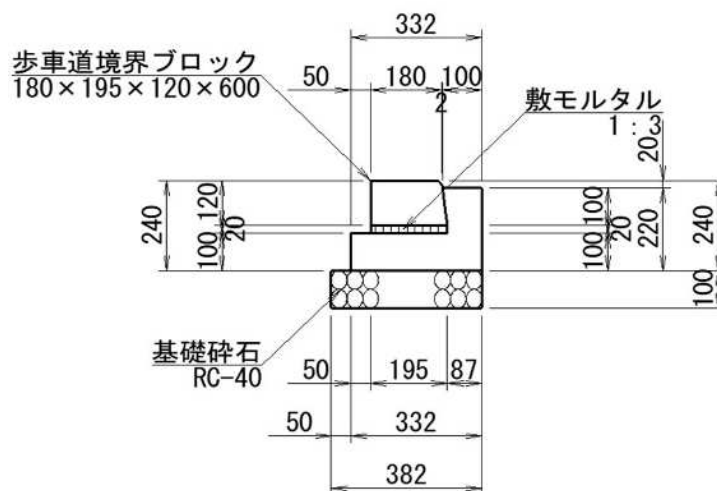

計第 58 表		BB-E20		1 箇所当たり		
名 称	規 格	計 算 式	10m当り 数量	延 長	数 量	単位
コンクリート	σ ck=18N/mm2	(1/2*(0. 10+0. 087)*0. 12+0. 332*0. 10)*10. 0	0. 444	31. 300	1. 390	m3
型枠	小型構造物	(0. 22+0. 10)*10. 0	3. 200	31. 300	10. 016	m2
基礎砕石	RC-40	0. 382*10. 0	3. 820	31. 300	11. 957	m2
基礎砕石	t=10cm	0. 382*0. 10*10. 0	0. 382	31. 300	1. 196	m3
敷モルタル	1 : 3	0. 195*0. 02*10. 0	0. 039	31. 300	0. 122	m3
目地モルタル	1 : 2	1/2*(0. 18+0. 195)*0. 12*0. 005*10. 0/0. 605	0. 002	31. 300	0. 006	m3
境界ブロック	180×195× 120×600	10. 0/0. 605	16. 500	31. 300	51. 645	個

区画線工 集 計 表

種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
区画線工				
溶融式区画線				
中央線（実線）	15cm・白色	m	22.9	
外側線（実線）	15cm・白色	m	116.0	
外側線（破線）	15cm・白色	m	11.0	
横断歩道	45cm・白色	m	28.0	
停止線	45cm・白色	m	9.3	
ゼブラ	45cm・白色	m	3.9	
横断歩道予告	15cm換算・白色	m	76.0	
溶融式区画線				
	15cm・白色・実線	m	138.9	
	15cm・白色・破線	m	11.0	
	45cm・白色	m	41.2	
	15cm換算・白色	m	76.0	
区画線消去	15cm	m	177.4	

計第 61 表

中央線

数量計算書

左			側		右			側					
測		点	延	長	備	考	測		点	延	長	備	考
							0			22.9			

計第 62 表

外側線（実線）

数量計算書

左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
NO. 0+4.8～NO. 12+11.0	54.0		NO. 0-3.5～NO. 10+4.2	62.0	
			NO. 10+9.6～NO. 12+15.9	0.0	
左側合計	54.0 m		右側合計	62.0 m	
			合計	116.0 m	

計第 63 表

外側線（破線）

数量計算書

[illegible]

計第 64 表

横断歩道

数量計算書

左			側		右			側					
測		点	延	長	備	考	測		点	延	長	備	考
							NO. 0-7. 4			28. 0		4m×7箇所	

計第 65 表

停止線

数量計算書

左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
NO. 0+2. 0	3. 5	県道	NO. 0-9. 2	2. 9	県道
			NO. 0+2. 1	2. 9	市道
左側合計	3. 5 m		右側合計	5. 8 m	
			合 計	9. 3 m	

計第 66 表

ゼブラ

数量計算書

左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
NO.0付近	3.9	5.7/1.45			
左側合計	3.9 m		右側合計	0.0 m	
			合 計	3.9 m	

計第 67 表

横断歩道予告

数量計算書

左側			右側		
測点	延長	備考	測点	延長	備考
2か所×19.0	38.0	県道	2か所×19.0	38.0	県道
左側合計	38.0 m		右側合計	38.0 m	
			合 計	76.0 m	

計第 68 表

区画線消去

数量計算書


左		側		右		側	
測	点	延 長	備 考	測	点	延 長	備 考
横断歩道予告 1か所×19.0m		19.0	県道	横断歩道予告 3か所×19.0m		57.0	県道
停止線 2.9×0.45/0.15		8.7		停止線 2.9×0.45/0.15		8.7	
				横断歩道 28.0×0.45/0.15		84.0	
左 側 合 計		27.7 m		右 側 合 計		149.7 m	
				合 計		177.4 m	

道路付属物撤去工 集 計 表

[illegible]


[illegible]

基礎図

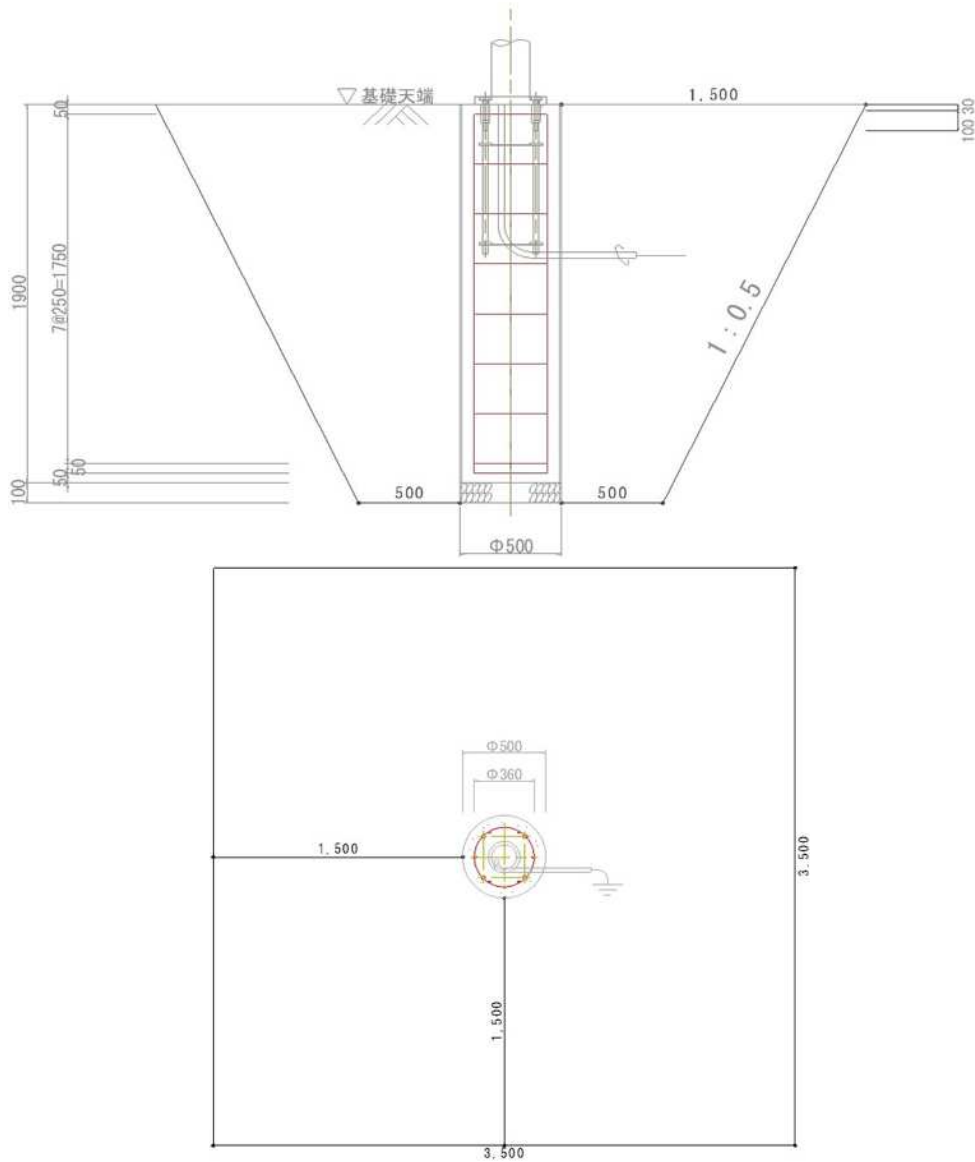

種 別	単位	規 格	数 量
舗装切断	m	As舗装 (t=3cm)	14.000
舗装版取壊し	m ²	As舗装 (t=3cm)	12.250
床 掘	m ³	標準 (砂質土)	13.687
埋 戻	m ³	標準 (砂質土)	12.665
路盤工	m ²	RC-40 (t=10cm)	12.250
As舗装	m ²	再生細粒度アスコン (t=3cm)	12.250
基礎碎石	m ²	RC-40 (t=10cm)	0.196

標識基礎

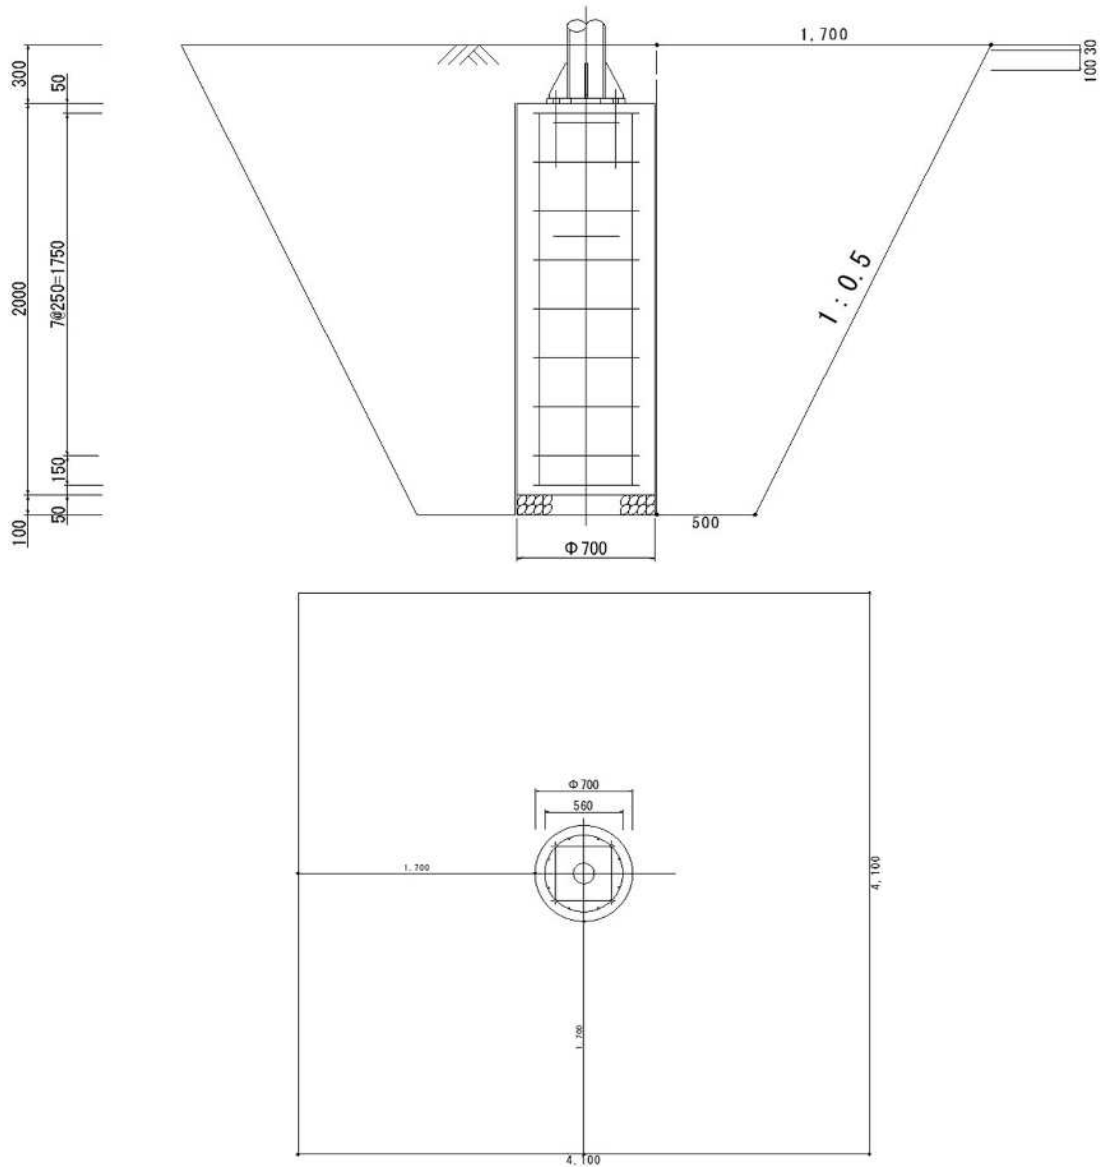


種 別	単位	規 格	数 量
舗装切断	m	As舗装 (t=3cm)	16.400
舗装版取壊し	m ²	As舗装 (t=3cm)	16.810
床 掘	m ³	標準 (砂質土)	21.232
埋 戻	m ³	標準 (砂質土)	19.870
路盤工	m ²	RC-40 (t=10cm)	16.810
As舗装	m ²	再生細粒度アスコン (t=3cm)	16.810
基礎碎石	m ²	RC-40 (t=10cm)	0.385

道路付属物設置工 集 計 表


[illegible]

基礎図

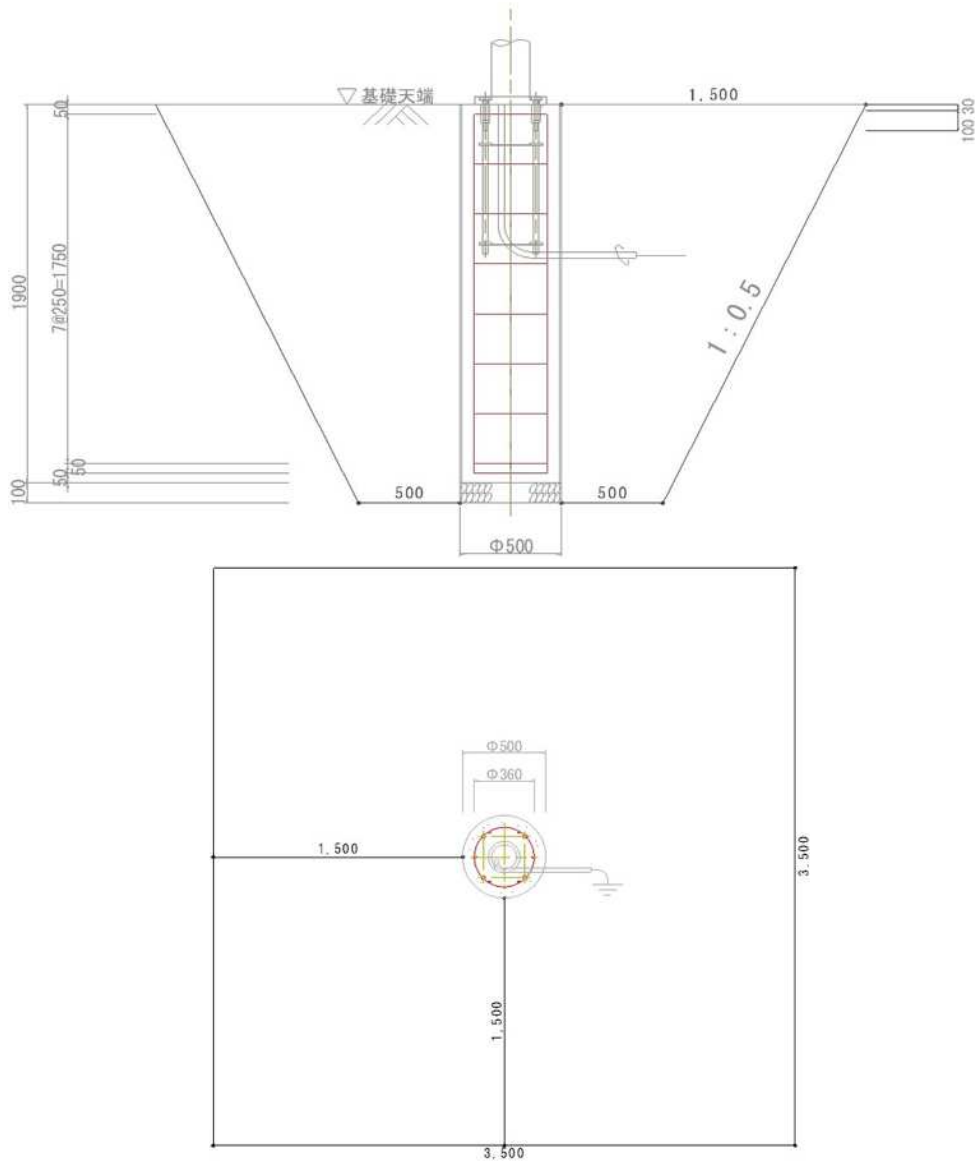

種 別	単位	規 格	数 量
舗装切断	m	As舗装 (t=3cm)	14.000
舗装版取壊し	m ²	As舗装 (t=3cm)	12.250
床 掘	m ³	標準 (砂質土)	13.687
埋 戻	m ³	標準 (砂質土)	12.665
路盤工	m ²	RC-40 (t=10cm)	12.250
As舗装	m ²	再生細粒度アスコン (t=3cm)	12.250
基礎碎石	m ²	RC-40 (t=10cm)	0.196

標識基礎

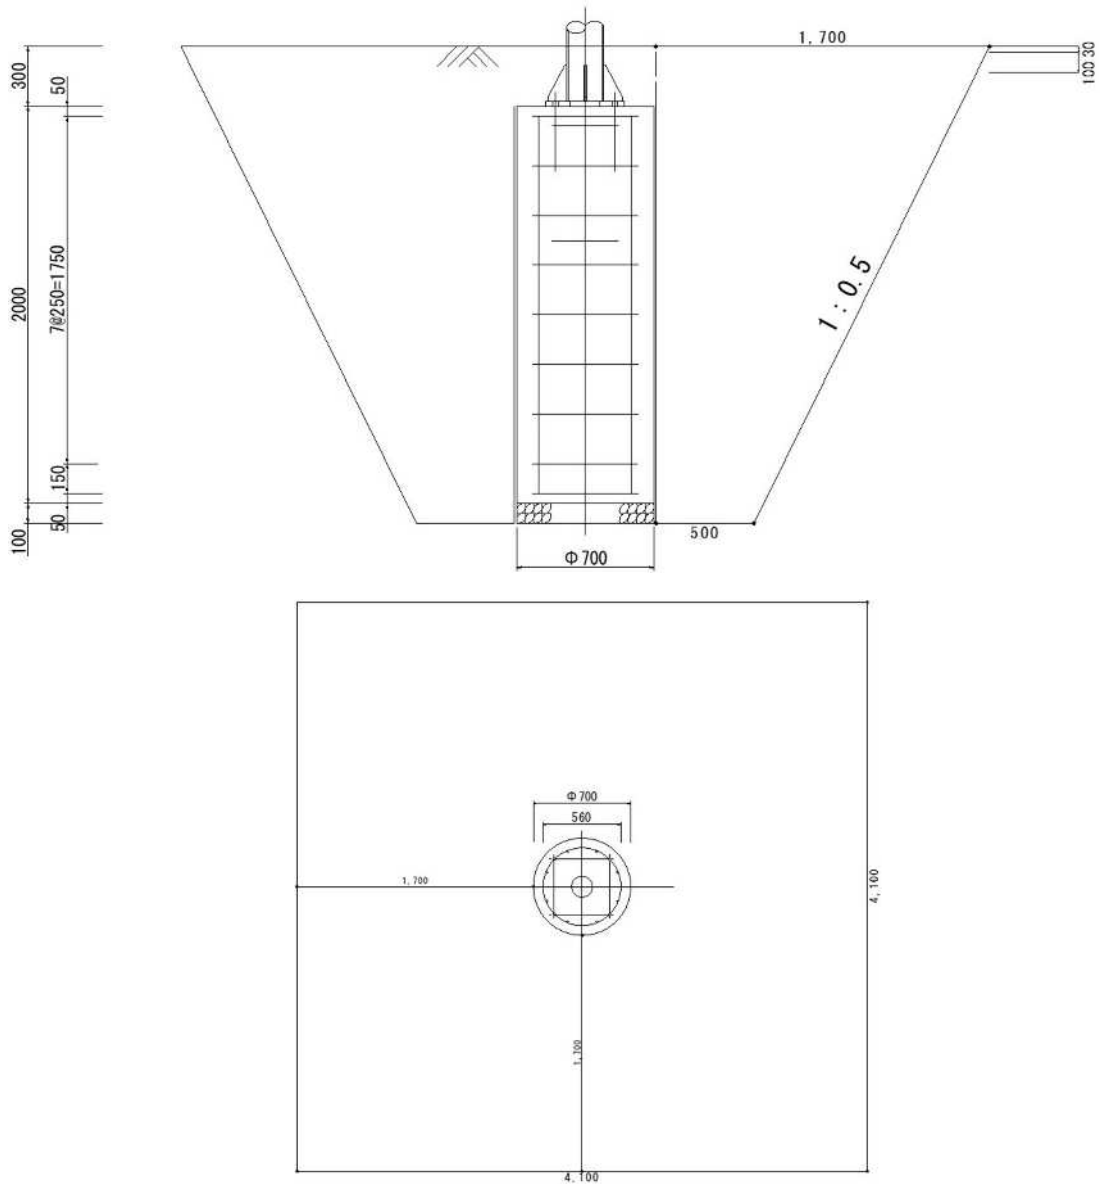

種 別	単位	規 格	数 量
舗装切断	m	As舗装 (t=3cm)	16.400
舗装版取壊し	m ²	As舗装 (t=3cm)	16.810
床 掘	m ³	標準 (砂質土)	21.232
埋 戻	m ³	標準 (砂質土)	19.870
路盤工	m ²	RC-40 (t=10cm)	16.810
As舗装	m ²	再生細粒度アスコン (t=3cm)	16.810
基礎碎石	m ²	RC-40 (t=10cm)	0.385
